


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ.2561รายสำนัก

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น.

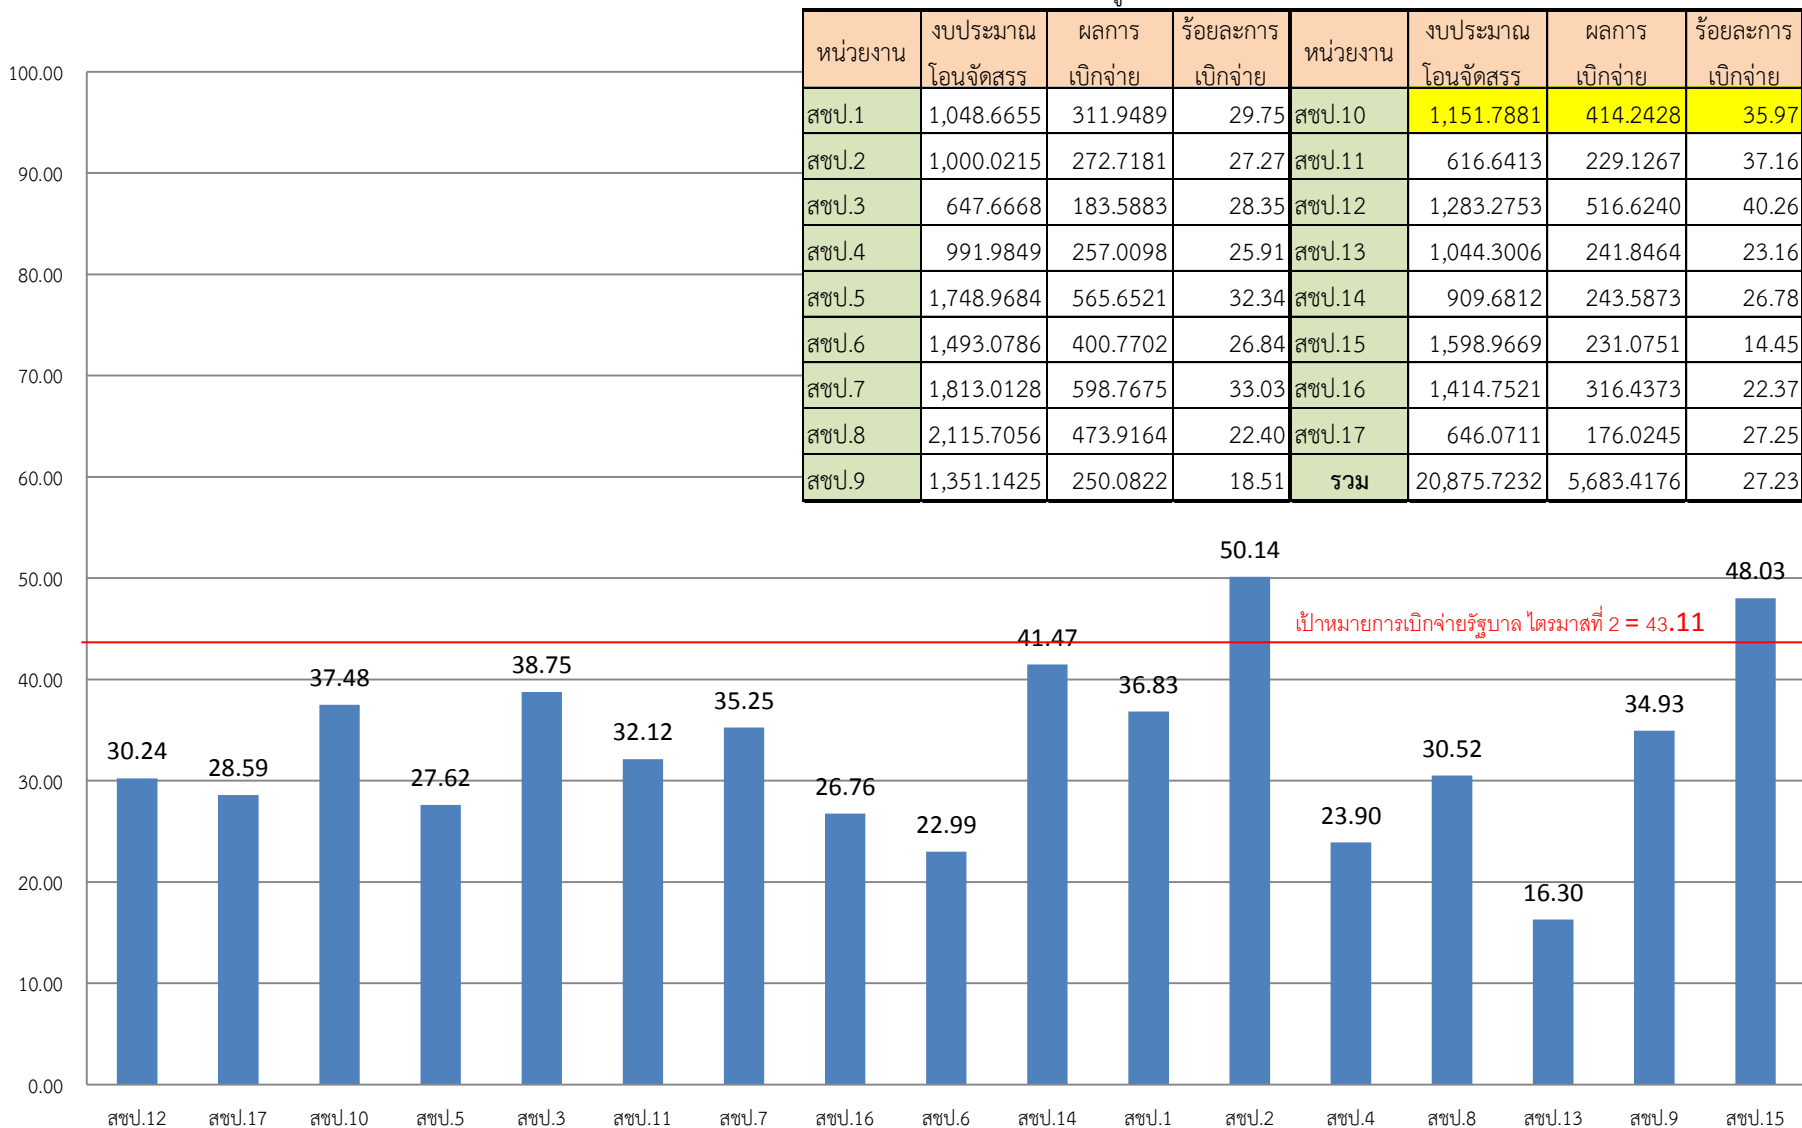

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561


สำนักงานชลประทานที่ 10 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น.

หน่วยของวงเงิน : บาท

หน่วยงานฯ ระดับโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่ายที่แต่ละหน่วยงานคาดการณ์ ณ สิ้น ไตรมาส 2 (31 มี.ค.2561)	
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		แจ้งยืนยันกรมฯ เมื่อ 25 ธ.ค.60	ปรับแผนล่าสุด เมื่อ 22 ก.พ.61
รวมทั้งสิ้น	1,151,788,061	161,092,264	990,695,797	414,242,799	3,445,183	410,797,615	35.97	46.26	44.50
มโนรมย์	101,437,576	2,325,676	99,111,900	68,169,868	1,000,000	67,169,868	67.20	60.33	80.77
ช่องแค	38,829,574	400,000	38,429,574	24,005,253	0	24,005,253	61.82	78.22	75.02
โคกกะเทียม	78,379,510	36,662,400	41,717,110	18,055,920	0	18,055,920	23.04	41.53	41.51
เริงราง	124,771,295	860,000	123,911,295	39,358,202	854,232	38,503,970	31.54	21.92	35.28
มหาราช	101,095,383	14,314,580	86,780,803	55,106,583	0	55,106,583	54.51	67.20	60.65
ป่าสักใต้	42,730,500	400,000	42,330,500	5,486,923	0	5,486,923	12.84	59.19	43.84
คลองเพรียว-เส้าไห้	12,994,900	400,000	12,594,900	8,026,794	0	8,026,794	61.77	65.59	66.48
นครหลวง	76,235,604	400,000	75,835,604	36,297,782	395,247	35,902,534	47.61	36.61	44.33
บางบาล	87,151,914	44,033,014	43,118,900	42,206,354	0	42,206,354	48.43	49.17	61.43
ป่าสักชลสิทธิ์	54,485,140	2,670,000	51,815,140	14,562,475	0	14,562,475	26.73	42.84	44.17
ลพบุรี	32,396,997	400,000	31,996,997	12,980,876	0	12,980,876	40.07	27.89	76.89
สระบุรี	56,076,704	1,178,000	54,898,704	12,067,518	599,664	11,467,854	21.52	45.92	48.84
พระนครศรีอยุธยา	66,081,700	400,000	65,681,700	19,820,594	400,000	19,420,594	29.99	47.92	47.85
เพชรบูรณ์	81,802,600	53,453,674	28,348,926	15,023,871	196,040	14,827,831	18.37	45.15	47.89
โครงการก่อสร้าง 10	148,263,261	3,194,920	145,068,341	22,399,531	0	22,399,531	15.11	44.49	12.61
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ	5,496,000	0	5,496,000	5,131,700	0	5,131,700	93.37	92.72	47.94
ส่วนเครื่องจักรกล	4,663,000	0	4,663,000	3,993,991	0	3,993,991	85.65	87.35	80.49
ส่วนวิศวกรรม	7,342,800	0	7,342,800	3,231,496	0	3,231,496	44.01	29.18	32.80
ฝ่ายบริหารทั่วไป	1,280,700	0	1,280,700	1,225,613	0	1,225,613	95.70	90.29	100.00
ส่วนกลาง (คำอำนวยความสะดวก)	30,272,903	0	30,272,903	7,091,455	0	7,091,455	23.43	30.00	26.22

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 อยู่ที่ร้อยละ 32.37 หรือ 379.480 ล้านบาท

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ.2561 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

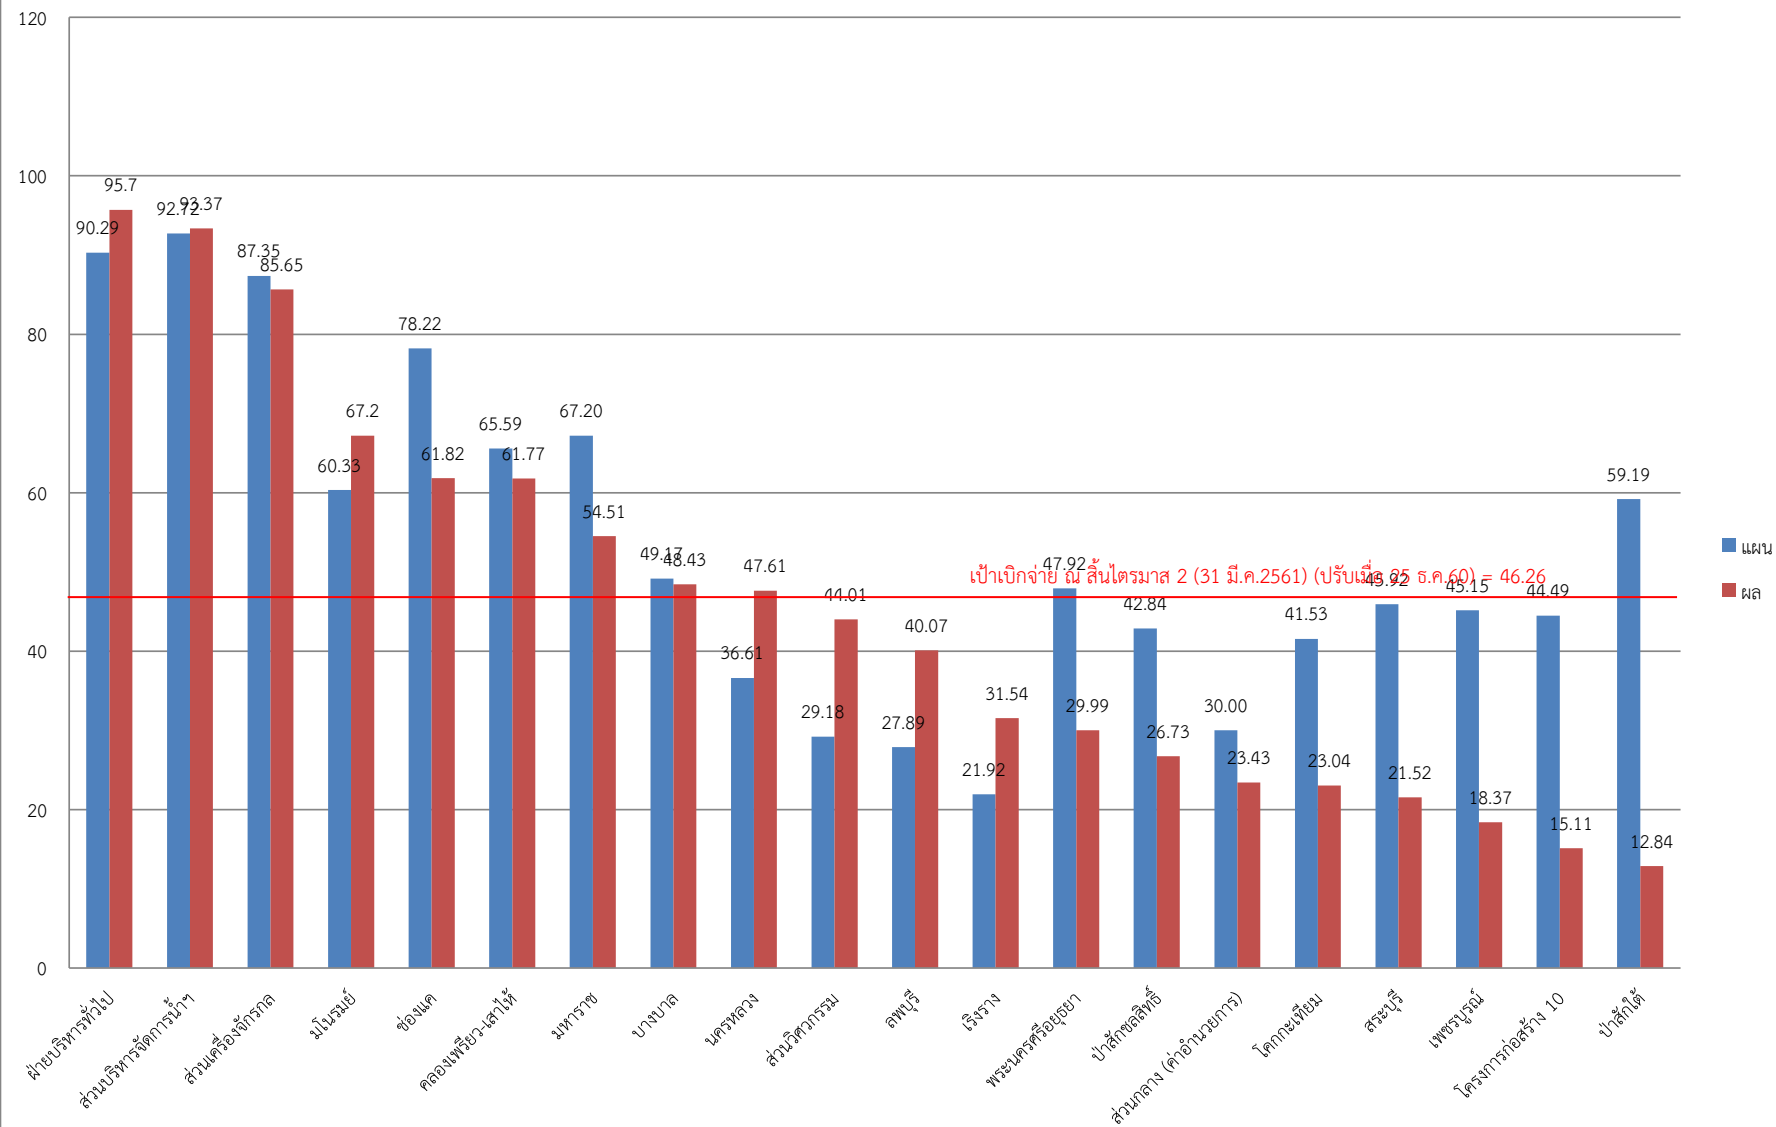

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ 12 มี.ค.2561 เวลา 12.00 น.

หน่วยงาน	จำนวน รายการ ทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ยังไม่ก่อนี้	ร้อยละ การจัดซื้อ จัดจ้าง	
			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัด จ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับ ราคา	ทำข้อ ผูกพัน	รวม			
มโนรมย์	63	151.93	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63		100
ช่องแค	38	49.26	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38		100
โคกกะเทียม	30	89.64	0	0	0	0	0	0	0	2	30	32		107
เริงราง	32	166.81	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32		100
มหาราช	60	115.77	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60		100
ป่าสักใต้	44	46.01	0	0	2	0	0	0	0	0	42	44	2	100
คลองเพรียว-เสาไห้	17	13.17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17		100
นครหลวง	35	88.05	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35		100
บางบาล	36	88.05	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36		100
ป่าสักชลสิทธิ์	29	57.26	0	0	0	0	0	0	0	1	28	29	1	100
ชป.ลพบุรี	27	33.21	4	6.71	0	0	0	0	0	0	23	23	4	85.19
ชป.สระบุรี	11	62.57	0	0	1	0	0	0	0	0	10	11	1	100
ชป.พระนครศรีอยุธยา	17	67.81	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17		100
ชป.เพชรบูรณ์	37	86.44	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37		100
ก่อสร้าง 10	4	247.45	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		100
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	9	5.50	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9		100
ส่วนเครื่องจักรกล	2	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		100
ส่วนวิศวกรรม	1	12.64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		100
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	2	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		100
ส่วนกลาง (ค่าอำนาจการ)	(276)	(0)	(276)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	494	1,433.98	4	7	3	0	0	0	0	3	486	492	8	99.60

รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ข้อมูลจากระบบติดตามออนไลน์ ณ วันที่ 12 มี.ค.2561

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการงาน	วงเงินงบประมาณ	คาดว่าจะก่อหนี้ ในวันที่	สถานภาพปัจจุบัน
1	ป่าสักใต้	(1.220) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามบัณฑิต กม.4+500 - กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	2,085,000	27 มี.ค.61	อยู่ระหว่างส่งผลการอนุมัติรับราคา รออนุมัติเงินงบประมาณ
2	ป่าสักใต้	(1.693) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	41,700	27 มี.ค.61	เริ่มเบิกจ่ายเมื่อดำเนินงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามบัณฑิต กม.4+500 - กม.11+000
3	ป่าสักชลสิทธิ์	(1.627) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	3,632,000	15 มี.ค.61	- ประกาศ TOR เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ EB ปส.จ. 01/2561 ลว.29 ม.ค.61 - ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 โดย หจก.สิงห์จัน เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท (งานนี้มีผู้เสนอราคาจำนวน 14 ราย) - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง และการขอรับการจัดสรร งบประมาณ.
4	ชล.ลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำปากคลองโพหนอง จังหวัดลพบุรี	3,311,617	14 มี.ค.61	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ 26 ก.พ.61
5	ชล.ลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำปากคลองสะพานขาว จังหวัดลพบุรี	1,267,269	14 มี.ค.61	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ 26 ก.พ.61
6	ชล.ลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำชุมชนถนนขวาง จังหวัดลพบุรี	1,029,515	14 มี.ค.61	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ 26 ก.พ.61
7	ชล.ลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำปากคลองสนามแจง จังหวัดลพบุรี	791,196	14 มี.ค.61	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ 26 ก.พ.61
8	ชล.สระบุรี	(1.686) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสระบุรี	25,400		เริ่มเบิกจ่ายเมื่อดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำตะเคียน
