


# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ.2561รายสำนัก

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.

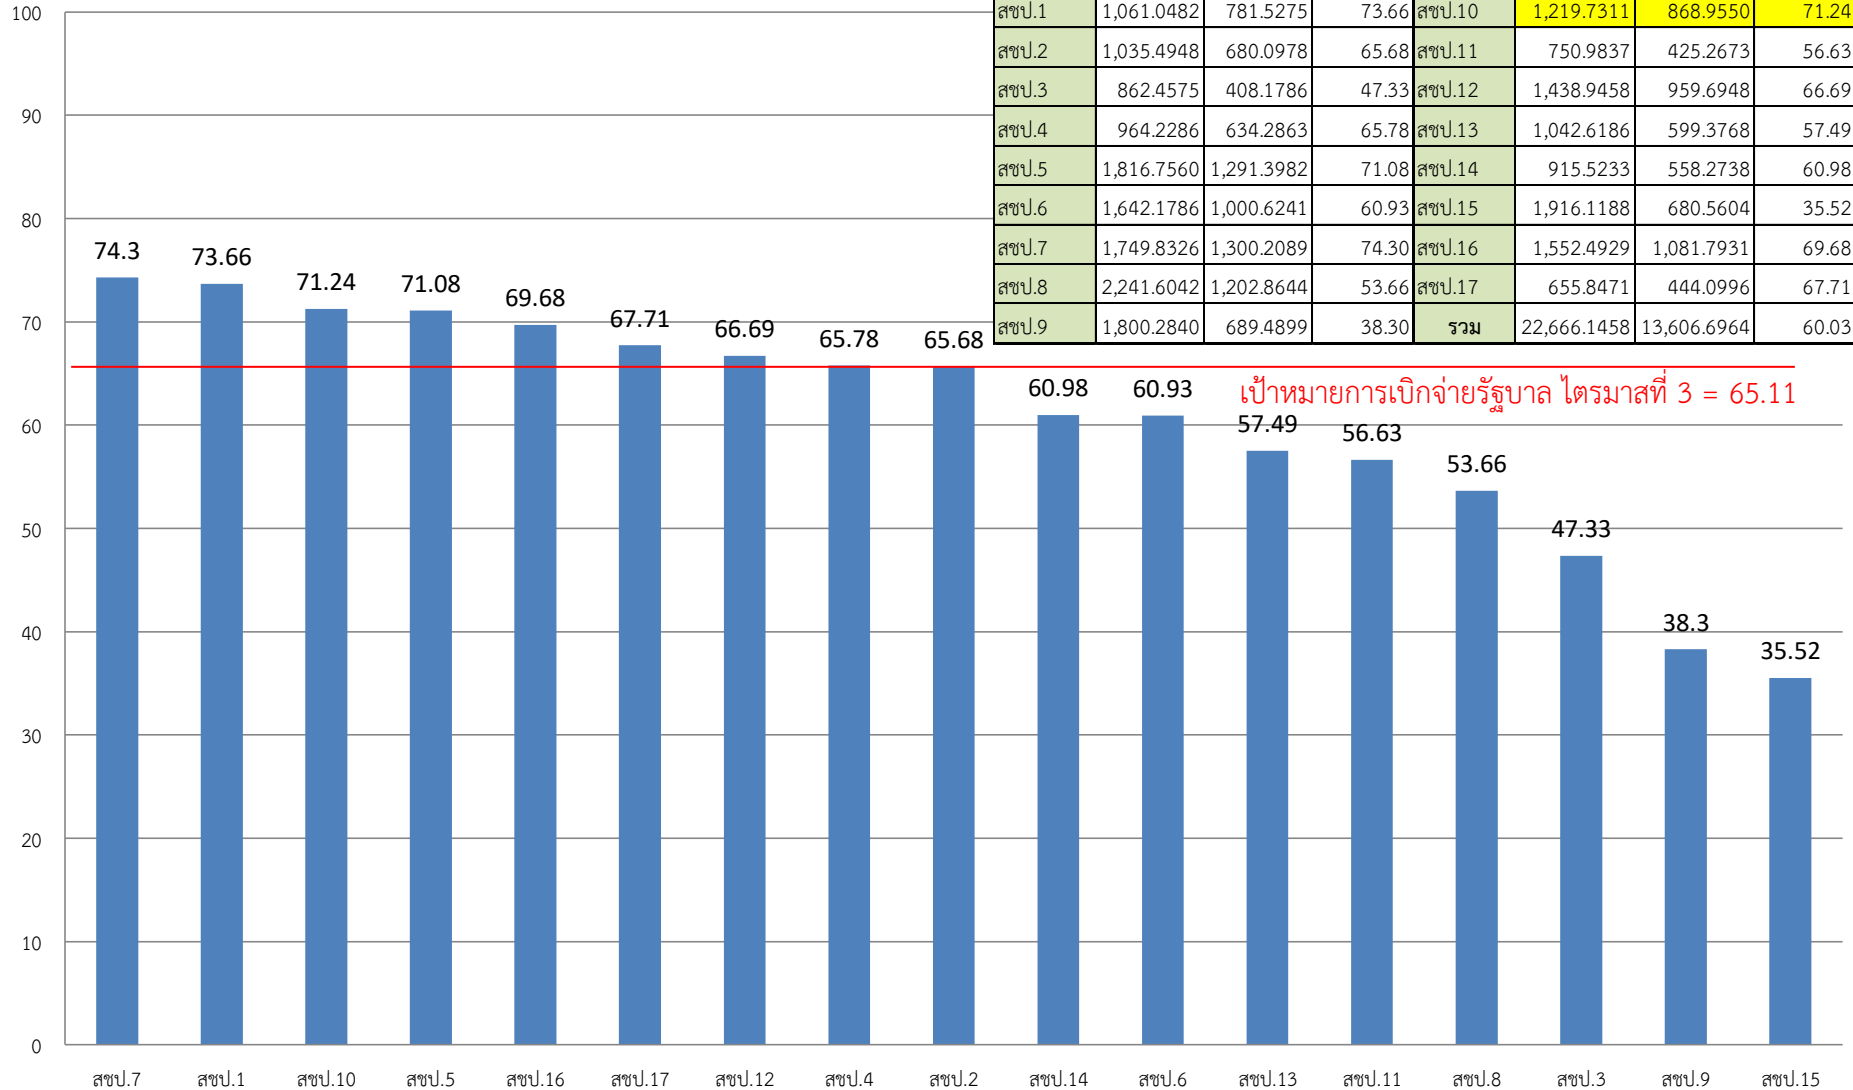


เป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 = 65.11

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561  
สำนักงานชลประทานที่ 10 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.

หน่วยงานฯ ระดับโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่ายที่แต่ละหน่วยงานคาดการณ์ ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย.2561)			มากกว่า แผน	น้อย กว่าแผน
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		แจ้งปรับกรมฯ เมื่อ 16 มี.ค.61	ประเมินเมื่อ 8 มิ.ย.61	ปรับเมื่อ 27 มิ.ย. 61		
รวมทั้งสิ้น	1,219,731,114	243,645,085	976,086,029	868,954,979	113,939,879	755,015,100	71.24	75.05	70.86	70.89	0.35	
มโนรมย์	103,433,627	2,325,676	101,107,951	91,630,335	2,325,676	89,304,659	88.59	98.68	98.68	98.68		10.09
ช่องแค	39,115,574	400,000	38,715,574	34,741,548	0	34,741,548	88.82	97.81	97.81	87.00	1.82	
โคกกระทิง	82,833,101	36,661,700	46,171,401	43,732,231	11,984,572	31,747,658	52.80	80.81	80.00	53.59		0.79
เริงราง	124,771,295	860,000	123,911,295	97,864,920	854,232	97,010,688	78.44	66.22	71.80	75.78	2.66	
มหาราช	98,768,224	14,314,580	84,453,644	82,257,358	3,454,772	78,802,586	83.28	86.51	83.00	83.00	0.28	
ป่าสักใต้	38,438,667	1,350,000	37,088,667	27,124,467	0	27,124,467	70.57	85.71	68.00	65.00	5.57	
คลองเพรียว-เสาไห้	12,994,900	400,000	12,594,900	11,329,282	399,991	10,929,292	87.18	75.54	81.06	86.76	0.42	
นครหลวง	81,283,364	395,248	80,888,116	56,091,460	395,248	55,696,212	69.01	62.07	62.07	62.51	6.50	
บางบาล	94,114,538	44,033,014	50,081,524	88,873,010	44,031,779	44,841,231	94.43	88.19	88.19	88.69	5.74	
ป่าสักชลสิทธิ์	54,484,740	2,670,000	51,814,740	35,707,423	0	35,707,423	65.54	77.23	64.94	77.23		11.69
ลพบุรี	34,559,020	400,000	34,159,020	29,700,007	398,729	29,301,278	85.94	95.83	85.00	78.00	7.94	
สระบุรี	47,288,996	1,676,960	45,612,036	39,726,938	742,224	38,984,714	84.01	72.26	79.33	84.01	0.00	
พระนครศรีอยุธยา	54,540,973	400,000	54,140,973	45,525,251	400,000	45,125,251	83.47	65.52	65.52	72.20	11.27	
เพชรบูรณ์	91,575,652	59,701,674	31,873,978	72,256,567	46,347,251	25,909,316	78.90	69.87	81.87	78.30	0.60	
โครงการก่อสร้าง 10	208,416,158	78,056,233	130,359,925	75,452,742	2,605,405	72,847,337	36.20	60.61	30.00	34.67	1.53	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	5,495,882	0	5,495,882	5,447,705	0	5,447,705	99.12	99.64	99.64	99.64		0.52
ส่วนเครื่องจักรกล	4,663,000	0	4,663,000	4,630,330	0	4,630,330	99.30	99.72	99.72	99.72		0.42
ส่วนวิศวกรรม	12,491,100	0	12,491,100	7,615,583	0	7,615,583	60.97	67.07	67.07	67.07		6.10
ฝ่ายบริหารทั่วไป	1,280,700	0	1,280,700	1,275,607	0	1,275,607	99.60	100	100	100		0.40
ส่วนกลาง (คำอำนวยการ)	29,181,603	0	29,181,603	17,972,215	0	17,972,215	61.59	52.74	52.74	55.24	6.35	

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 อยู่ที่ร้อยละ 67.11 หรือ 818.8111 ล้านบาท (ยอดจัดสรร 1,220.038 ล้านบาท)

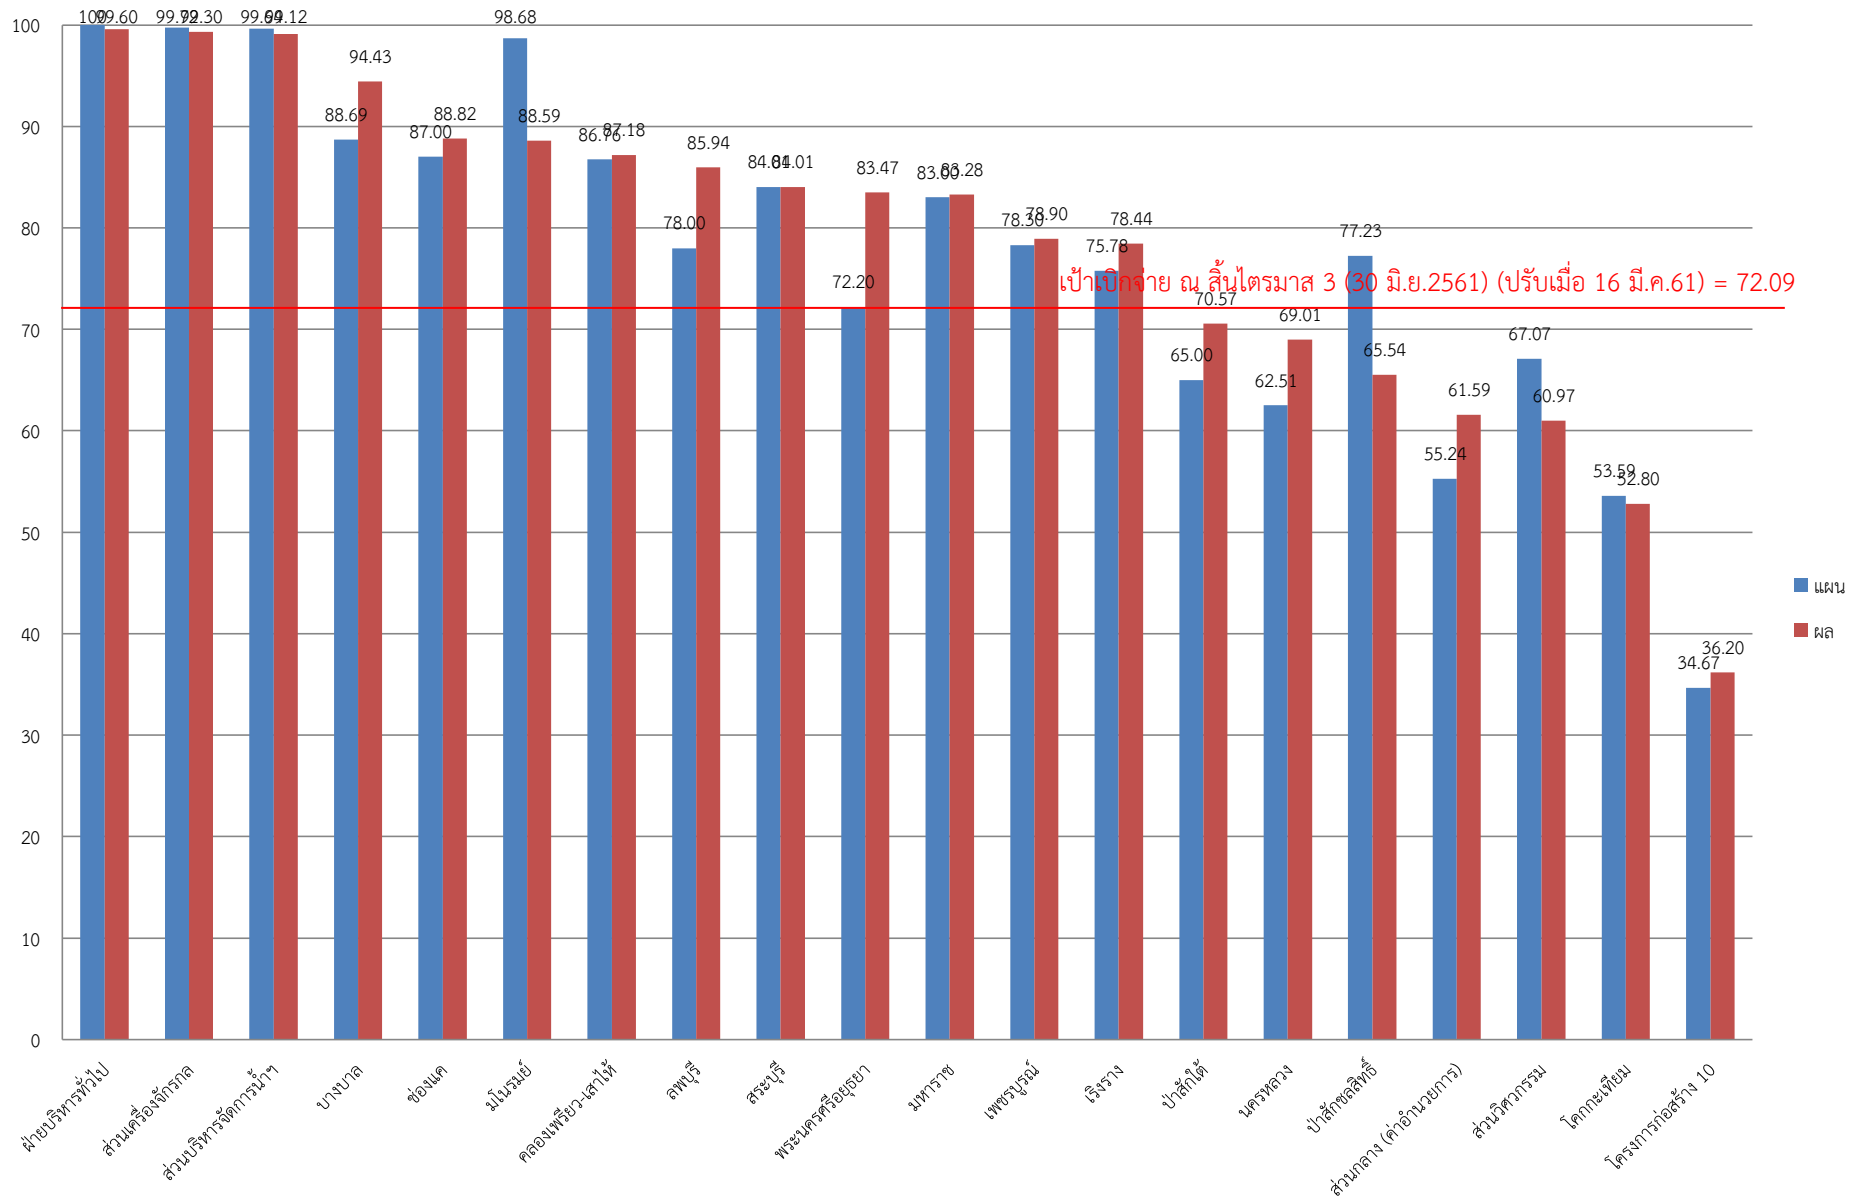

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบปกติ)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ 30 มิ.ย.2561 เวลา 16.30 น.

หน่วยงาน	จำนวน รายการ ทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ยังไม่ก่อนนี้	ร้อยละ การจัดซื้อ จัดจ้าง	
			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัด จ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับ ราคา	ทำข้อ ผูกพัน	รวม			
มนอรมย์	65	153.97	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	100
ช่องแค	40	49.56	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	100
โคกกะเทียม	31	94.64	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	100
เริงราง	32	166.81	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	100
มหาราช	62	118.87	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	0	100
ป่าสักใต้	44	46.01	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	100
คลองเพรียว-เสาไห้	17	13.17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	100
นครหลวง	37	93.35	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	100
บางบาล	40	96.35	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	100
ป่าสักชลสิทธิ์	29	57.26	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	100
ชป.ลพบุรี	29	35.51	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	100
ชป.สระบุรี	12	63.36	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	100
ชป.พระนครศรีอยุธยา	17	67.81	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	100
ชป.เพชรบูรณ์	43	96.88	1	1.700	2	0	0	0	0	1	39	42	4	98
ก่อสร้าง 10	4	247.45	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	9	5.50	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100
ส่วนเครื่องจักรกล	2	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100
ส่วนวิศวกรรม	1	12.64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	2	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100
ส่วนกลาง (คำอำนวยการ)	(294)	(0)	(294)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>รวม</b>	<b>516</b>	<b>1,433.98</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>512</b>	<b>515</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ 30 มิ.ย.2561 เวลา 16.30 น.

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ยังไม่ก่อนนี้	ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง	
			จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำข้อผูกพัน	รวม			
มโนรมย์	13	8.5700	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100
ช่องแค	5	55.0500	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	100
โคกกะเทียม	7	19.3370	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	6	100
เริงราง	5	31.2800	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100
มหाराช	22	268.6470	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	100
ป่าสักใต้	6	116.9500	0	0	2	0	1	0	0	0	3	6	3	100
คลองเพรียว-เส้าไห้	3	19.0820	* 1	17.5320	0	0	0	0	0	0	2	2	1	66.67
นครหลวง	3	3.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100
บางบาล	7	51.7200	* 1	16.0000	0	0	0	0	0	0	6	6	1	85.71
ป่าสักชลสิทธิ์	3	98.7800	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100
ชป.ลพบุรี	9	5.8200	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100
ชป.สระบุรี	2	1.5500	* 1	0.5000	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50.00
ชป.พระนครศรีอยุธยา	2	11.0400	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	100
ชป.เพชรบูรณ์	14	106.9000	0	0	0	0	0	1	10	0	3	14	11	100
ส่วนกลาง	1	20.5812	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100
<b>รวม</b>	<b>102</b>	<b>819.1072</b>	<b>3</b>	<b>34.0320</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>97.06</b>

**หมายเหตุ**

1. โครงการฯ คลองเพรียว-เส้าไห้ อยู่ระหว่างทำเรื่องขอยกเลิก 1 รายการ (ปรับปรุงถนนคันคลอง 2 ขวา เส้าไห้ ตำบลไถ่เส้า อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี)
2. โครงการฯ บางบาล รอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ 1 รายการ
3. โครงการ ชป.สระบุรี อยู่ระหว่างทำเรื่องขอยกเลิก 1 รายการ (ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณปี 2561 เพิ่มเติม (ไทยนิยม ยั่งยืน)

สำนักงานชลประทานที่ 10 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.

หน่วยงานฯ ระดับโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	คาดการณ์ ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย.2561)	มากกว่า แผน	น้อยกว่า แผน
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง				
รวมทั้งสิ้น	801,272,200	484,340,000	316,932,200	25,644,267	280,596	25,363,672	3.20	6.23		3.03
มโนรมย์	8,570,000	0	8,570,000	4,640,553	0	4,640,553	54.15	40.00	14.15	
ช่องแค	55,050,000	0	55,050,000	232,824	0	232,824	0.42	2.76		2.34
โคกกะเทียม	19,337,000	0	19,337,000	660,901	0	660,901	3.42	24.23		20.81
เริงราง	31,280,000	24,300,000	6,980,000	2,283,900	0	2,283,900	7.3	1.66	5.64	
มหาราช	268,647,000	222,695,000	45,952,000	8,987,252	280,596	8,706,657	3.35	1.90	1.45	
ป่าสักใต้	116,950,000	82,570,000	34,380,000	798,965	0	798,965	0.68	2.14		1.46
คลองเพรียว-เส้าไห้	19,082,000	17,091,000	1,991,000	106,060	0	106,060	0.56	32.26		31.70
นครหลวง	3,800,000	0	3,800,000	2,011,666	0	2,011,666	52.94	38.10	14.84	
บางบาล	35,720,000	31,978,000	3,742,000	2,173,230	0	2,173,230	6.08	17.91		11.83
ป่าสักชลสิทธิ์	98,780,000	0	98,780,000	2,063,902	0	2,063,902	2.09	8.96		6.87
ลพบุรี	5,820,000	0	5,820,000	332,143	0	332,143	5.71	24.54		18.83
สระบุรี	1,550,000	0	1,550,000	36,100	0	36,100	2.33	0	2.33	
พระนครศรีอยุธยา	9,205,000	7,928,000	1,277,000	273,779	0	273,779	2.97	3.07		0.10
เพชรบูรณ์	106,900,000	97,778,000	9,122,000	1,042,992	0	1,042,992	0.98	2.55		1.57
ส่วนแผนงาน	20,581,200	0	20,581,200	0	0	0	0	37.00		37.00

งานกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2560 (งบปกติ)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online วันที่ 30 มิ.ย.2561 เวลา 16.30 น.

ลำดับ ที่	รายการงาน	หน่วยงาน	ยอดกันเหลือปี (บาท)			ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี (บาท)			ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (%) สะสม	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จ (เดือน/ปี)	หมายเหตุ
			วงเงินงบประมาณ	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง				
	<b>พ.ร.บ.60</b>		<b>23,639,399</b>	<b>6,440,520</b>	<b>17,198,879</b>	<b>486,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,303.00</b>				
1	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	ป่าสักชลสิทธิ์	4,600,050	4,600,050		0.00		-	0.00	48.68	31 ส.ค.61	
3	ฝายบ้านปากห้วยต่าน	ชป.เพชรบูรณ์	7,263,988.00		7,263,988.00	-			0.00	60.24	31 ก.ค. 61	
4	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโอง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	10,340,375	1,840,470	8,499,905	486,303.00		486,303.00	4.70	7.00	30 ก.ย.61	
5	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านพาสน์ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	1,434,986		1,434,986	0.00			0.00	90.00	30 มิ.ย.61	
	<b>งบกลาง กปร. ปี 2560</b>		<b>5,875,597</b>	<b>5,771,730</b>	<b>103,867</b>	<b>3,078,440.00</b>	<b>2,974,573.00</b>	<b>103,867.00</b>				
1	โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นตอนล่าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	มหาราช	5,875,597	5,771,730	103,867	3,078,440.00	2,974,573.00	103,867.00	52.39	51.54	30 ก.ค.61	
	<b>รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.</b>		<b>112,899,000</b>	<b>27,587,000</b>	<b>85,312,000</b>	<b>32,794,569</b>	<b>0</b>	<b>32,794,569</b>				
1	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของคลองเมขลาให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอ	ชป.พระนครศรีอยุธยา	10,000,000		10,000,000	7,217,974.00		7,217,974.00	72.18	60.00	30 ก.ย.61	
2	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของคลองระบายน้อยบางบาล 4 ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลสนามไชย ตำบลบ้านเป็ง ตำบลสนามไชย,บ้านเป็ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	8,324,000		8,324,000	5,362,729.00		5,362,729.00	64.42	13.00	30 ก.ย.61	
3	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของทางสิ่งให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลโรงช้าง ตำบลบางนา โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลโรงช้าง ตำบลบางนา ตำบลโรงช้าง,บางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	6,239,000		6,239,000	5,421,182.00		5,421,182.00	86.89	95.00	31 ก.ค.61	
4	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม (อาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด) ตำบลบ้านโพธิ์,หัวเวียง,บ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	9,076,300	8,811,000	265,300	265,300.00		265,300.00	2.92	15.00	27 ต.ค.61	สั่งเข้าทำงานเมื่อต้นเดือน พ.ค.61 (ก่อนหน้านั้นเกษตรกรใช้น้ำ)
5	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของคลองโรงช้างให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ ตำบลราชคราม ตำบลโพแดง โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ ตำบลราชคราม ตำบลโพแดง ตำบลช้างใหญ่,ราชคราม,โพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	10,000,000		10,000,000	8,697,586.00		8,697,586.00	86.98	82.00	31 ก.ค.61	
6	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคูลิ่งน้ำของคลองพระยาบรรลือให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลสิงหนาท ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ชป.พระนครศรีอยุธยา	10,000,000	9,710,000	290,000	1,393,734.45		1,393,734.45	13.94	90.00	4 ก.ย.61	





งานกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2560  
(ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบ 60 เพิ่มเติม))

ลำดับที่	รายการงาน	หน่วยงาน	ยอดวงเงินจัดสรร (บาท)			ยอดวงเงินตามผลการจัดทา			ยอดกันเหลือ ปี (บาท)	การเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี		ผลเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี (สะสมตั้งแต่เริ่มจนถึง วันที่ 30 มิ.ย.61) (บาท)			ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม	ผลการ ดำเนินงาน (%) สะสม	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จ (เดือน/ปี)
			วงเงิน งบประมาณ	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงิน งบประมาณ	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		เบิกจ่ายแล้ว (ช่วงหลังกัน เหลือปี- 30 ก.ย.60) (บาท)	คงเหลือยอดกันเหลือ ปีที่จะต้องเบิก (บาท)	รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง			
	<b>แผนงานส่วนจังหวัด</b>		<b>151,450,800</b>	<b>7,385,000</b>	<b>144,065,800</b>	<b>141,547,937</b>	<b>5,739,000</b>	<b>135,808,937</b>	<b>87,621,388</b>	<b>1,910,532</b>	<b>91,509,492</b>	<b>111,707,748</b>	<b>778,803</b>	<b>110,928,945</b>	<b>78.92</b>		
1	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม. 127+714 (สถานีสูบน้ำบ้านหม้อ) ตำบลบางโหนด อำเภอ บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี	เริงราง	40,000,000		40,000,000	31,704,137		31,704,137	10,960,511.94	1,910,531.85	9,049,980.09	30,792,761.99		30,792,761.99	97.13	95 30 มิ.ย.61	
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์คู่ม่าน้ำป่าสัก ระยะ ที่ 2 จำนวน 1 งาน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ป่าสักชลสิทธิ์	15,943,800		15,943,800	15,943,800		15,943,800	10,247,293.10		10,247,293.10	14,026,744.99		14,026,744.99	87.98	95 มิ.ย.61	
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนของพ่อ จำนวน 1 งาน ตำบลหนอง บัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ป่าสักชลสิทธิ์	19,000,000		19,000,000	19,000,000		19,000,000	11,995,922.80		11,995,922.80	10,341,980.40		10,341,980.40	54.43	55 ส.ค.61	
4	งานสวนหลวงสามฤดูแล้ง จำนวน 1 งาน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ป่าสักชลสิทธิ์	10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	2,507,199.74		2,507,199.74	9,356,832.00		9,356,832.00	93.57	95 ส.ค.61	
5	งานปรับปรุงแหลมป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 1 งาน ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ป่าสักชลสิทธิ์	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000	42,666,349.38		42,666,349.38	39,926,539.63		39,926,539.63	79.85	80 ส.ค.61	
6	ฝายบ้านคลองมะขามเฒ่า ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคก เจริญ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง 10	16,507,000	7,385,000	9,122,000	14,900,000	5,739,000	9,161,000	9,244,111		15,042,747	7,262,889.00	778,803.00	6,484,086.00	48.74	94.64 30 มิ.ย.61	
