

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓
ประจำเดือน (ครั้งที่ ๒)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑.	ม.ล.อนุมาศ	ทองแถม	ผส.ชป.๓
๒.	ว่าที่ร้อยตรีสมชัย	แดงไทย	ผวศ.ชป.๓
๓.	นายชลเทพ	ทาดรี	ผบร.ชป.๓
๔.	นายโสภิญญา	เกิดสกุล	ผปก.ชป.๓
๕.	นายเถลิง	ศิริภิรมย์	ผคก.ชป.๓
๖.	นางนงลักษณ์	โพธิ์ทอง	ผบท.ชป.๓
๗.	นายনীที	นุ่นมาก	แทน ผอ.คป.พิษณุโลก
๘.	นายบุญยลักษณ์	ฉลองศัพท์ัญญ	ผอ.คป.อุตรดิตถ์
๙.	นายสมยศ	แสงมณี	ผอ.คป.พิจิตร
๑๐.	นายสุรพล	อจละนันท์	ผอ.คป.นครสวรรค์
๑๑.	นายประพนธ์	คำไทย	ผอ.คป.เขื่อนนเรศวร
๑๒.	นายชัยโรจน์	พดุมวงศ์	ผอ.คป.พลายชุมพล
๑๓.	นายโฆสิต	พื้งเมือง	ผอ.คป.ดงเสาชฐี
๑๔.	นายประเวศน์	ศิริศิลป์	ผอ.คป.ท่าบัว
๑๕.	นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผอ.คป.ยมน่าน
๑๖.	นายธนู	โพธิ์เอี้ยง	ผอ.คส.ชป.๓
๑๗.	นายสมหมาย	จิ้นขจร	แทน ผสญ.๑๔
๑๘.	นางอุบล	รัตนซ้อง	แทน ผสญ.๑๒
๑๙.	นายสมหวัง	เจริญสุข	แทน ผคน.๓
๒๐.	นายสุทธิพงษ์	กุลานพวงศ์	ผศป.ที่ ๒
๒๑.	นางอัญชลี	โพธิ์คลี่	แทน สจจ.พิษณุโลก
๒๒.	นางสุวัฒนา	วัจฉลพงษ์	แทน สจจ.พิจิตร
๒๓.	นายเสนีย์ชัย	ช่อผูก	แทน ผจม.๓
๒๔.	นายชัยวัฒน์	ทสะสังคินทร์	ผด.ผด.๓
๒๕.	นายวินัย	สุ่มเจริญ	ผส.รว.ภาคเหนือ
๒๖.	นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๓
๒๗.	นายผัน	ศรีมา	สก.นช.๒
๒๘.	นายฉัตรชัย	ทองปอนด์	กอบ.ชป.๓
๒๙.	นายธีรพงษ์	บุญศัพท์	กพค.ชป.๓
๓๐.	นายประดิษฐ์	สิทธิยศ	กธว.ชป.๓
๓๑.	นายชานนท์	แก้วเขียว	ผสร.ชป.๓
๓๒.	นายนพดล	เชาว์วรนนท์	ผบข.ชป.๓
๓๓.	นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ผงส.ชป.๓
๓๔.	นายเกษม	ไกรสีกาจ	ผปน.ชป.๓

๓๕.	นายพิรัตน์	เกตุนันท์	ผชน.ชป.๓
๓๖.	นายประเสริฐ	เฮงสุวรรณ	ผจ.ชป.๓
๓๗.	นายจรรยา	จาดี	ผสส.ชป.๓
๓๘.	นายชัยวุฒิ	รชตะพิพัฒน์	นิติกร สชป.๓
๓๙.	นางราตรี	น้อยเจริญ	บง.ชป.๓
๔๐.	นายบำรุง	นิยมธรรมนิตย์	จก.ชป.๓
๔๑.	นางดวงใจ	ศรีศุภอรรถ	พด.ชป.๓
๔๒.	นายปริญญา	สมศักดิ์	ปชส.ชป.๓
๔๓.	นายพันธ์เทพ	แสงแก้ว	รช.ชป.๓
๔๔.	นายภูมิรักษ์	รัตนผล	กอบ.คส.ชป.๓
๔๕.	นายวัชร	จิตใจงาม	แทน ผวศ.คป.พิษณุโลก
๔๖.	นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ผวศ.คป.นครสวรรค์
๔๗.	นายณัฐพงศ์	ครุฑทา	ผจน.คป.พิจิตร
๔๘.	นายสาทิศ	บุษดาจันทร์	ผวศ.คป.เขื่อนนเรศวร
๔๙.	นายถาวร	ตะวี	ผจน.คป.ดงเศรษฐี
๕๐.	นายวิชากร	จองพิพัฒน์พงษ์	ผวศ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (รก.)
๕๑.	นายเทพนิมิต	สิงห์พันธ์	ผวศ.คป.ยมน่าน
๕๒.	นายตรีภพ	เกื้อเม่ง	ผจน.คป.ยมน่าน
๕๓.	นายสุรสิทธิ์	แตงน้อย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๕๔.	นายอุทัย	คุณคง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๕๕.	นายสุรียา	ดาวเรือง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๕๖.	นายสุรพล	รัตนวิมลชัย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๕๗.	น.ส.ฐิชารัตน์	โรจนจิรารัตน์	ช่างฝีมือสนาม ข ๓
๕๘.	น.ส.นัณฐิกา	วงศ์ทะกั้น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕๙.	น.ส.ธิดารัตน์	เดชจบ	พนักงานทั่วไป บ ๑

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๓

◆ กล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้-

๑. การประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ขอให้ประชุมอาทิตย์แรกของเดือน เนื่องจาก

ผอ.โครงการ มีประชุมจังหวัด

๒. ขอขอบคุณ **ผปก.ชป.๓** ที่จัดทำมาตรฐานระเบียบวาระการประชุม โดยนำตัวอย่างการประชุมของผู้บริหารกรม เป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

๓. ตามหนังสือ **ค.ร.ม.** ขอให้สำนัก **ตรวจสอบสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง** ซึ่งปีนี้ คาดว่าฤดูฝนจะล่าช้าไป ๒ สัปดาห์ ในเขตพื้นที่ สชป.๓ จะส่งน้ำถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และลดปริมาณน้ำตามลำดับ เรื่องนี้ขอฝาก **ผอ.คป. ผอ.คบ. ทำแผนการบริหารจัดการน้ำ**

๔. ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง

๕. ขอให้ทุกโครงการทำแผนการจัดการน้ำช่วงฤดูฝน เพราะฤดูฝนจะล่าช้าไป ๒ สัปดาห์ จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอให้ สบ.คป. สบ.คบ. ตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ผบพ.ชป.๓ ● รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ งานธุรการ สชป.๓ ได้นำขึ้น website ของสำนักแล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.๓ ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ผส.ชป.๓ ● ขอแก้ไข หน้าที่ ๑๒ พชส.ชป.๓ ผู้รายงานหัวข้อ ปัญหาที่พบ คือ สำนักใช้ Sever ของกรม ขอแก้ไข จาก "Sever" เป็น "Server"

ผอ.คป.อุตรดิตถ์ ● ขอแก้ไข หน้าที่ ๕ บรรทัดสุดท้าย จาก "กรมป่าไม้" เป็น "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

๓.๑ การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

ผบร.ชป.๓ ● ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้.-

- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน ๒,๓๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๕ %
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน ๒,๘๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๙ %
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้การได้จำนวน ๓๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๓%

● จากแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ สำนักได้รับการจัดสรรน้ำจากกรมรวมทั้งสิ้น ๖๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย **โครงการฯ อุตรดิตถ์** เพื่ออุปโภค-บริโภค ได้รับการจัดสรรมา ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร **โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน** ๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร **โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร **โครงการฯ นครสวรรค์** ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร **โครงการพัฒนาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก** ๑๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร **สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า** ๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับแผนการส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ มีพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูก จำนวน ๓๕๙,๙๐๐ ไร่ ปัจจุบัน มีการเพาะปลูกแล้ว จำนวน ๑,๐๒๖,๐๐๐ ไร่ ประมาณ ๒๘๕ % เกินแผนไปมาก ปริมาณน้ำที่สำนักใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ประมาณ ๙๑ % เหลือเวลาอีกเดือนกว่า คาดว่าปริมาณน้ำที่ใช้จะเกินแผนเล็กน้อย **ศูนย์ประมวลผลสถานการณ์น้ำ** ได้มีการประชุม โดยมี **รชบ.** เป็นประธาน และได้กำชับขอให้**โครงการฯ** ควบคุมปริมาณน้ำให้เป็นไปตามแผน และขอให้ทุก**โครงการฯ** **รณรงค์** และติดตามการใช้น้ำของเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และรณรงค์เรื่อง **งดการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ ๒** เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากปีนี้ฤดูฝนอาจจะล่าช้าประมาณ ๒ อาทิตย์ ฤดูฝนจะเริ่มประมาณต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอให้**โครงการฯ** ช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำหนังสือแจ้งเตือนการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือติดป้ายโฆษณา และการดำเนินงานต่างๆ ขอให้รายงานสำนัก และกรมทราบด้วย

ผส.ชป.๓ ● ขอทราบเรื่องที่ **ผอ.คป.พิจิตร** ไปประชุมที่จังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปีนี้มี การถามถึงการใช้น้ำหรือไม่

ผอ.คป.พิจิตร ● ตามที่ได้เข้าประชุมร่วมกับจังหวัด ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันให้ที่ประชุมทราบ และได้ทำหนังสือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและงดทำนาปรังครั้งที่ ๒ แจ้งนายอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ปัจจุบันสถานีสูบน้ำ ๒๔ สถานี เริ่มมีปัญหา เนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมแห้งขอด ต้องขอขอบคุณโครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล และสำนัก ที่ช่วยผลักดันน้ำไปช่วยที่อำเภอสามง่ามเป็นบางส่วน

๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ฝงจ.ชป.๓ ● สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย เงินกันเหลือในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ และงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ตามตารางสรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ที่	โครงการ	รวมเงินกันฯ (ล้านบาท)	สรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖				หมายเหตุ (ข้อมูล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)
			๑.)งบตาม พรบ.	๒.) งบกลาง ครม. สัญจร	๓.) งบกลาง กปร.	๔.) งบกลาง สำรองจ่าย*	
	รวม	๑๓๕.๔๙๖	๒๙.๘๐๓	๔๔.๓๙๖	๒๖.๒๙๕	๓๕.๐๐๐	
๑	ชป.อุตรดิตถ์	๒๔.๔๔๔	๔.๖๐๐	-	๑๙.๘๔๔		๑.) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.- ๒.) ฝายหัวน้ำต๊ะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐.-
๒	ชป.พิษณุโลก	๒๒.๑๐๙	-	๑๕.๖๕๘	๖.๔๕๑		๑.) แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.- ๒.) ฝายวังสีจรรยา : ๖,๔๕๑,๐๐๐.-
๓	ชป.พิจิตร	๕๖.๓๙๐	๒.๐๐๐	๑๙.๖๙๒	-	๓๔.๖๙๘	๑.) ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒.) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.- ๓.) ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโชนฯ : ๑๙,๘๒๙,๐๐๐.- ๔.) สถานีสูบน้ำฯ จากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง : ๑๔,๘๖๗,๒๐๐.-
๔	ชป.นครสวรรค์	๒๖.๓๑๐	๑๗.๔๑๐	๘.๙๐๐	-		๑.) สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวฯ : ๕,๖๕๕,๑๒๙.- ๒.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑ : ๑๑,๗๕๕,๑๐๑.- ๓.) ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : ๘,๙๐๐,๐๐๐.-
๕	ท่าบัว	๓.๑๕๔	๓.๑๕๔	-	-		๑.) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.- ๒.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.-
๖	เขื่อนแควน้อยฯ	๒.๖๓๙	๒.๖๓๙	-	-		๑.) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.-
๗	ส่วนกลาง สชป.๓	๐.๔๕๐	-	๐.๑๔๘	-	๐.๓๐๒	๑.) ค่าอำนวยการ ขุดลอกห้วยแก้วฯ : ๑๔๘,๐๐๐.- ๒.) ค่าอำนวยการ ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโชนฯ : ๑๗๑,๐๐๐.- ๓.) ค่าอำนวยการ สถานีสูบน้ำฯ จากแม่น้ำน่าน : ๑๓๐,๘๐๐.-

ฝงจ.ชป.๓ ● งบกลางสำรองจ่ายฯ **สำนัก**ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเดือน มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕.๐๐ ล้านบาท ได้แก่.-

- * **โครงการฯ พิจิตร** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๓๔.๖๘๘ ล้านบาท ดังนี้.-
 ๑. ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโชนฯ จำนวน ๑๙,๘๒๙,๐๐๐ บาท
 ๒. สถานีสูบน้ำฯ จากแม่น้ำน่าน ไปตำบลท่าหลวง จำนวน ๑๔,๘๖๑,๒๐๐ บาท
- * **ส่วนกลาง สชป.๓** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๓๐๑,๘๐๐บาท ดังนี้.-
 ๑. ค่าอำนวยการ ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโชนฯ จำนวน ๑๗๑,๐๐๐ บาท
 ๒. ค่าอำนวยการ สถานีสูบน้ำฯ จากแม่น้ำน่าน ไปตำบลท่าหลวง จำนวน

๑๓๐,๘๐๐ บาท

สรุป ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

ลำดับ	รายการ	รวมเงินกันฯ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
	รวม	๑๓๕.๔๙๖	๕๕.๓๗๓	๔๐.๘๗%	
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์					
		๒๔.๔๔๔	๑๒.๙๔๔	๕๒.๙๕%	
๑	ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.-	๔.๖๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๒	ฝายห้วยน้ำต๊ะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐.-	๑๙.๘๔๔	๑๒.๙๔๔	๖๕.๒๓%	งบกลาง กปร.
โครงการชลประทานพิษณุโลก					
		๒๒.๑๐๙	๒๑.๒๑๕	๙๕.๙๖%	
๓	แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.-	๑๕.๖๕๘	๑๕.๖๕๘	๑๐๐.๐๐%	งบกลาง ครม.สัญจร
๔	ฝายวังสัจธรรมฯ : ๖,๔๕๑,๐๐๐.-	๖.๔๕๑	๕.๕๕๘	๘๖.๑๕%	งบกลาง กปร.
โครงการชลประทานพิจิตร					
		๕๖.๓๙๐	๖.๐๓๖	๑๐.๗๐%	
๕	ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๖	ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.-	๑๙.๖๙๒	๔.๐๓๖	๒๐.๕๐%	งบกลาง ครม.สัญจร
๗	ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโชน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ	๑๙.๘๒๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
๘	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง	๑๔.๘๖๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ

ลำดับ	รายการ	รวมเงินกันนำ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
โครงการชลประทานนครสวรรค์		๒๖.๓๑๐	๑๔.๖๗๐	๕๕.๗๖%	
๙	สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : ๕,๖๕๕,๑๒๙.-	๕.๖๕๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๑๐	ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลา : ๘,๙๐๐,๐๐๐.-	๘.๙๐๐	๖.๒๖๐	๗๐.๓๔%	งบกลาง ครม.สัญญา
๑๑	ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง ทิวงานที่ ๑	๑๑.๗๕๕	๘.๔๑๐	๗๑.๕๔%	งบกันไว้เบิกเหลือปี ๕๕
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว		๓.๑๕๔	๐.๔๕๖	๑๔.๔๖%	
๑๒	ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.-	๒.๖๙๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.-	๐.๔๕๖	๐.๔๕๖	๑๐๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย		๒.๖๓๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	
๑๓	ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.-	๒.๖๓๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
ค่าอำนวยการสำนึกา		๐.๔๕๐	๐.๐๕๑	๑๑.๓๙%	
๑๔	ขุดลอกห้วยแก้วฯ : (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๔๘	๐.๐๕๑	๓๔.๖๒%	งบกลาง ครม.สัญญา
๑๕	ระบบส่งน้ำบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๗๑	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
๑๖	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไปต.ท่าหลวง (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๓๑	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ

ผจ.ขป.๓ ● ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ

ผอ.คป.อุตรดิตถ์ ● งานปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้ำ : จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อวางระบบท่อส่งน้ำ

ผอ.คป.พิจิตร ● งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว : งบประมาณ ๑๙,๖๙๒,๐๐๐ บาท (งบกลาง: ครม.สัญญา) สั่งเข้าทำงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการดำเนินงานประมาณ ๓๐ %
- สำหรับงานระบบส่งน้ำบ้านไทรโรงโขน บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ และงานระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่าน เป็นงบกลางสำรองจ่าย เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ผอ.คป.นครสวรรค์ ● สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : งบประมาณ ๕,๖๕๕,๑๒๙ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา และดำเนินการเรื่องเอกสาร

ผอ.คบ.ท่าบัว ● **งานประตูละบายน้ำปากคลอง DR.๗** : งบประมาณ ๒,๖๙๘,๐๐๑ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ● **งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน** : งบประมาณ ๒,๖๓๙,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) จะเริ่มดำเนินงานอีกครั้งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประมาณ ๓ สัปดาห์ จึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ต่อไป

ผวจ.ชป.๓ ● **ค่าอำนวยการของสำนัก** เป็นเงินกัน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็น ๑๑.๓๙ %

สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๕๗

สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ทุกประเภทงบประมาณ)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

ที่	ประเภทงบประมาณ	โอนจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
			วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
			(บาท)	(%)		
สรุปภาพรวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)		458,762,737	86,987,790	18.96	371,774,947	
ข้อ 1 งบตาม พรบ. ปี 2557 (ปรากฏข้อ+LS.)		458,762,737	86,987,790	18.96	371,774,947	
ข้อ 2 งบกลาง ครม.สัญจร ปี 2557		-	-	-	-	
ข้อ 3 งบกลาง กปร. โครงการพระราชดำริ		-	-	-	-	
ข้อ 4 <u>เงินกันเหลือมีปี</u>		135,496,372	55,373,022	40.87	80,123,350	
เงินกันเหลือมีปี 2555		11,755,101	8,409,501	71.54	3,345,600	
เงินกันเหลือมีปี 2556		123,741,271	46,963,521	37.95	76,777,750	

เป้าหมายเบิกจ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2556

- เป้าหมายเบิกจ่าย กรมา
- เป้าหมายเบิกจ่าย สขป.3
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน เฉลี่ย 17 สขป.

10.00%
36.12%
-

ผลเบิกจ่าย

- 8.96% ↑ สูงกว่า เป้าหมาย กรมา
- 17.16% ↓ ต่ำกว่า เป้าหมาย สขป.3
- ? ผลการเบิกจ่ายเฉลี่ย 17 สขป.

ผส.ชป.๓ ✦ มอบ ผวจ.ชป.๓ ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่าย และติดตามการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกโครงการฯ


ผวจ.ชป.๓ ● ผลการเบิกจ่ายของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (จาก website กองการเงิน) ปัจจุบันอยู่ในลำดับที่ ๑

ผส.ชป.๓ ✦ ขอขอบคุณโครงการฯ ที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดผลการเบิกจ่าย

สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับ โครงการ) จากระบบ online

ที่	โครงการ	โอนจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย		ลำดับครั้งที่ผ่านมา
			(บาท)	(%)	
๑	ชป.พิษณุโลก	๒๙๒,๙๒๐,๑๕๖	๑๔๑,๓๓๓,๗๔๗	๔๘.๒๕	๑
๒	ชป.อุตรดิตถ์	๗๖,๖๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๖๘,๘๑๕	๒๓.๕๗	๔
๓	ชป.นครสวรรค์	๗๘,๐๔๓,๔๒๐	๑๘,๐๘๗,๖๒๙	๒๓.๑๘	๓
๔	ชป.พิจิตร	๕๘,๙๐๔,๖๐๐	๙,๘๘๔,๗๘๘	๑๖.๗๘	๒
๕	เขื่อนนเรศวร	๑๐,๘๒๘,๒๐๐	๘๐๙,๘๒๒	๗.๔๘	๕
๖	ท่าบัว	๕๘,๓๑๘,๙๘๓	๓,๔๑๑,๙๖๗	๕.๘๕	๗
๗	ก่อสร้าง	๖๗,๕๖๐,๑๐๐	๒,๘๘๐,๔๐๗	๔.๒๖	๖
๘	พลาซามูล	๓๘,๗๙๙,๓๕๒	๙๖๘,๔๒๘	๒.๕๐	๗
๙	เขื่อนแควน้อยฯ	๒๖,๒๘๘,๐๒๙	๓๔๓,๙๒๘	๑.๓๑	๗
๑๐	ยมน่าน	๕,๐๖๐,๖๐๐	๖๕,๑๕๓	๑.๒๙	๗
๑๑	ดงเศรษฐี	๑๙,๕๘๙,๗๕๑	๔,๘๔๔	๐.๐๒	๗

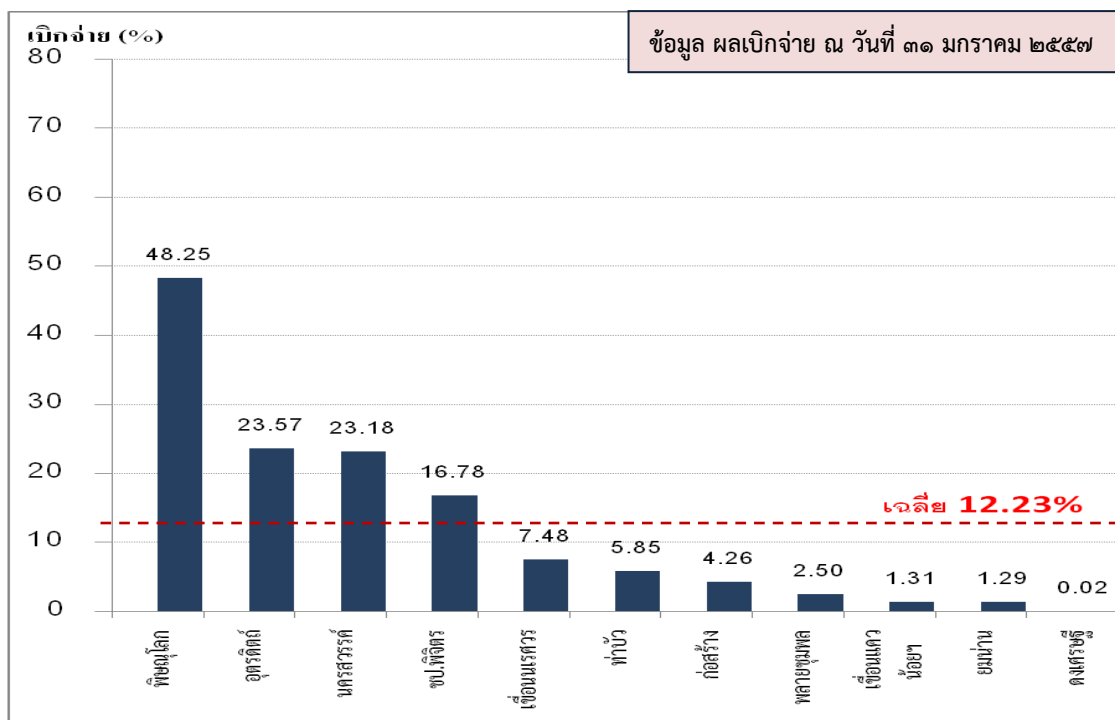

พส.ชป.๓

✦ ขอให้โครงการฯ ที่ลำดับผลการเบิกจ่ายอยู่ใน ๔ ลำดับท้าย ชี้แจงในที่ประชุม

ผอ.คบ.ตงเศรษฐิ ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐิ งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้แรงงานคนเป็นหลัก คือ งานบริหารการส่งน้ำในเขตโครงการฯ ปัจจุบันจ้างคนงานแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย

ผอ.คบ.ยมน่าน ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน รายการงานส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว คาดว่าเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะเริ่มดำเนินงานได้

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นงานจ้างเหมา จำนวน ๓ สัญญา จำนวนเงินประมาณ ๒๐ ล้านบาท หากดำเนินการเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ทั้ง ๓ งาน

ผอ.คบ.พลาญชุมพล ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล เป็นงานปรับปรุง ๒ รายการ ต้องดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้แล้วเสร็จตามมติ ค.ร.ม. ปัจจุบันคงเหลือการเบิกค่าแรง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ผวจ.ชป.๓ ● รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ Online ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าของงานให้ทราบ หากงานใดคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผูกพันไม่ทัน ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้ชี้แจงปัญหา และอุปสรรค เพื่อจะได้รายงานให้กองแผนงานทราบต่อไป

ผส.ชป.๓ ✦ มอบ ผวจ.ชป.๓ สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อติดตามในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย

ผวจ.ชป.๓ ● รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบรายงาน Online ขอให้โครงการฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.คส.ชป.๓ ● โครงการก่อสร้าง สชป.๓ มี ๕ รายการงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผอ.คป.นครสวรรค์ ● โครงการชลประทานนครสวรรค์ มี ๒๕ รายการงาน รายการงานที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน คือ งานซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๔ (LS) จึงไม่ลงรายละเอียดในช่องวันที่ลงนามในสัญญา

ผอ.คป.พิจิตร ● โครงการชลประทานพิจิตร มี ๑๖ รายการงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบุงฯ เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่องเริ่มสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา

ผอ.คป.พิษณุโลก ● โครงการชลประทานพิษณุโลก มี ๒๔ รายการงาน ๒ รายการงาน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ในช่องวันที่อนุมัติรับราคา และวันที่ลงนามในสัญญา คือ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รัก และงานปรับปรุงอาคารป้องกันกัดเซาะฝายน้ำเพื่อพร้อมอาคารประกอบ

ผอ.คป.อุตรดิตถ์ ● โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มี ๑๘ รายการงาน ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มี ๑๒ รายการงาน เป็นงานปรับปรุงระบบสื่อสารฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๓ แห่ง และงานอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบในบริเวณฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ปัจจุบันดำเนินการอนุมัติรับราคาและลงนามในสัญญาแล้ว

ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร มี ๑๓ รายการงาน เป็นงานดำเนินการเอง ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่ได้ลงรูปถ่าย

ผอ.คบ.ดงเศรษฐี ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี มี ๑๒ รายการงาน งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-79.9R-53.8 R ปัจจุบันดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่ยังไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผอ.คบ.ท่าบัว ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มี ๑๖ รายการงาน มีงานประกวดราคา ๒ งาน ปัจจุบันดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ

ผอ.คบ.พลาญชุมพล ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล มี ๑๒ รายการงาน ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกรายการงานแล้ว แต่ยังไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผอ.คบ.ยมน่าน ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มี ๘ รายการงาน เป็นงานจ้างเหมา อยู่ระหว่างรอเงินงวดและลงนามในสัญญา ส่วนงานดำเนินการเองที่เป็นการสอบราคาและตกลงราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้

ผส.ขป.๓ ✦ ขอให้ทุกโครงการฯ กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ลงข้อมูลใน Web Online ให้เป็นปัจจุบันด้วย

๓.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM)

ผส.ขป.๓ ✦ การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทำงานในฐานะ CKO สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือน สขป.๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ กล่าวถึงเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาและสาเหตุการเกิดอุทกภัยให้ที่ประชุมรับฟังไปแล้ว สำหรับครั้งนี้ขอถ่ายทอดในส่วนของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอันเกิดขึ้นจากน้ำดังต่อไปนี้

แนวทางแก้ไขปัญหา แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง

๑. ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่.-

๑.๑ สสำรวจสภาพแหล่งน้ำ ลำน้ำใหญ่ และลำน้ำสาขา ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ สขป.๘ พบว่ามีปริมาณน้ำทั้งหมด ๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับน้ำได้ ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงได้พิจารณาหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการชลอน้ำและเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ในส่วนของขั้นตอนและการดำเนินโครงการก็พบกับปัญหา อุปสรรคบ้างพอสมควร

๑.๒ พิจารณหาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิง ไว้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง และแก้ปัญหาหน้าท่วมในระยะยาว

๑.๓ แก้ปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ เช่น จัดทำฝาย ท่อลอด เป็นต้น โดยทำประชาพิจารณ์ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ทำการออกแบบการก่อสร้างต่างๆ ในลักษณะเป็นประตูระบายน้ำหรือฝาย เมื่อถึงฤดูฝนจะสามารถระบายน้ำลงแม่น้ำมูลได้เร็วขึ้น ฤดูแล้งก็สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้

๑.๔ เนื่องจากการพัฒนาเมืองและชุมชน ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น เช่นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้ลำน้ำแคบลง ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงไปจากที่เคยระบายน้ำได้ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือเพียงระบายน้ำได้ ๒๕-๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที กรณีการขุดลอก ต้องพิจารณาถึงข้อกำหนดและเอกสารหลักฐานเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว เดิมเป็นพื้นที่สาธารณชนประโยชน์ แต่ถูกจับจองถือครองเป็นที่ดินส่วนบุคคล

๑.๕ ในส่วนของตัวลำคลองที่มีทิศทางเข้าสู่ตัวเมืองโดยตรง แนวทางแก้ไข คือ ทำเป็นคลองผันน้ำ โดยขุดลอกคลองจากลำน้ำลำตะคอง ผันน้ำออกไปเป็นลำน้ำลำเชียงไกร เพื่อช่วยระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุด

๑.๖ พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูล ช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

๒. การบริหารจัดการน้ำ วางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อช่วยป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำอย่างบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันทางช่องทางต่างๆ สำหรับการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ขอนำเรื่องประสบการณ์จากการทำงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาให้ที่ประชุมรับฟังต่อไป

ผวศ.ชป.๓ ● รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

● สืบเนื่องจากการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก จากผลสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านไปได้ ๓ องค์ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้-

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำ องค์ความรู้ที่เลือก คือ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพัฒนาโครงการเบื้องต้นในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำ องค์ความรู้ที่เลือก คือ การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ องค์ความรู้ที่เลือก คือ การพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อการคืนหลักประกันของ

แผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ทีมงานจัดการความรู้ สชป.๓ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมกำหนด โดยเสนอผู้บริหารจัดการความรู้สำนัก ลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ และนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดแผนการจัดการความรู้ของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทางเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.๓

● สำหรับการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และบูรณาการจัดการความรู้ ทั้ง ๗ ขั้นตอน ซึ่งคณะทำงานในแต่ละหมวด (หมวด ๒-หมวด ๖) จะได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป หากโครงการฯใด มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ได้ ขอให้ส่งข้อมูลมาที่สำนัก ทีมงานจัดการความรู้ สชป.๓ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.๓ ต่อไป

ผส.ชป.๓ ✦ มอบ ผวศ.ชป.๓ ประสานกับโครงการฯ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.๓

✦ ขอให้ทีมงานจัดการความรู้ สชป.๓ ดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ที่กำหนดไว้ และพิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.๓ ครั้งต่อไป

๓.๔ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผบร.ชป.๓ ● การประกวด ผสب. ดีเด่น กรมได้เชิญประชุม ผอ.โครงการ ทั่วประเทศ และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา ผสบ. ไม่ให้ความร่วมมือ ปี ๒๕๕๗ กรมกำหนดหลักเกณฑ์ว่า หาก ผสบ. ท่านใด ไม่ได้ทำเล่มและไม่ส่งเล่ม ให้กับสำนัก หรือโครงการฯ ก็จะไม่มีการเลื่อนเป็นระดับอาวุโส การประกวดแม้จะได้ที่ ๑ หากทำคะแนนไม่ถึง ๕๐๐ คะแนน ก็อาจจะไม่ได้เลื่อนเป็นระดับอาวุโสเช่นเดียวกัน ส่วนจัดสรรน้ำฯ จึงจัดอบรมบรรยายเทคนิคการทำเล่มประเมินให้ ผสบ. ทุกโครงการฯ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ที่สำนักชลประทานที่ ๓ โดยได้เชิญคุณวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิบาล-ภิบาลผา สชป.๒ ที่เคยชนะการประกวดลำดับ ๑ ของภาคเหนือ -

- และเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ปี ๒๕๕๗ ให้คำแนะนำในการทำเล่มประเมิน และประสบการณ์ในการถามตอบ ข้อซักถามของคณะกรรมการ มีแนวทางอย่างไรที่ทำให้ได้คะแนนสูง ซึ่ง**ส่วนจัดสรรน้ำ** ได้ทำ**ปฏิทินในการประกวด สป. ดีเด่น** ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ **โครงการฯ** และ **สป.** จะต้องทำเอกสารส่งให้คณะทำงานในระดับสำนัก ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น**คณะทำงานระดับ สป.** จะดำเนินการประเมิน **ฝส.คป.** ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ และประเมิน **ฝส.คป.** ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการระดับสำนักจะมีการคัดเลือกผลงาน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อได้ตัวแทนระดับสำนัก **กรมจะมีการอบรมตัวแทนของแต่ละ สป.** จำนวน ๓๔ คน ประมาณวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

ผวค.ขป.๓ ● **ขอรายงานแผนการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมปี ๒๕๕๗ ส่วนวิศวกรรม** **บริหาร**มีแผนที่จะดำเนินการทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ ได้รับอนุมัติแล้ว ๙๓ โครงการ และทำงานแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ **พร้อมทั้งได้รวบรวมรายละเอียดผลการเตรียมความพร้อมด้านพิจารณาโครงการ** สำรวจ และออกแบบ ของ **โครงการฯ ต่างๆ** และนำขึ้นเว็บไซต์**ส่วนวิศวกรรมบริหาร**แล้ว

● เมื่อวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มี**การประชุมร่วมกันของส่วนวิศวกรรมฯ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำ และโครงการฯ** เพื่อพิจารณาปรับแผน MTEF แล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นที่ทราบตรงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการตอบข้อมูลข้อร้องเรียน-ร้องขอโครงการต่างๆ

● สำหรับงานนอกแผนของโครงการฯ หากเป็นงานเร่งด่วน **ส่วนวิศวกรรมฯ** ไม่ขัดข้อง ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นลำดับแรก

ผปก.ขป.๓ ● **แนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๗** ขอให้**โครงการฯ** ตรวจสอบเงินเหลือจ่าย หากมีความประสงค์จะนำไปใช้จ่ายเพื่อการใด **ขอให้รายงานสำนักทราบ**เพื่อจะได้พิจารณาในภาพรวมและดำเนินการตามที่กองแผนงานให้แนวทางไว้ต่อไป

ผคก.ขป.๓ ● **สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือน สขป.๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ท่าน ผส.ขป.๓** มอบหมายให้**ส่วนเครื่องจักรกล** ประสานกับ**กรมเจ้าท่า**ในการขอใบอนุญาตขับเรือยนต์ และใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ โดยขอให้**โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ พิษณุโลก โครงการฯ อุดรดิตถ์ โครงการฯ พิจิตร และโครงการฯ นครสวรรค์** ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนายท้ายเรือ และขอใบอนุญาตนั้น ปัจจุบันโครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ นครสวรรค์ ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่แล้ว ขอให้โครงการฯ ที่เหลือเร่งดำเนินการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้**ส่วนเครื่องจักรกล**รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งการฝึกอบรม และออกใบอนุญาตต้องเดินทางไปทำที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้ประสานกับกรมเจ้าท่าจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ไว้แล้ว

● สำหรับการเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน **ส่วนเครื่องจักรกล**ได้มอบให้ **ฝสส.ขป.๓** ประสานข้อมูล ดั่งนั้นจึงขอมอบ **ฝสส.ขป.๓** ซึ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝสส.ขป.๓ ● **ได้ประสานหารือกับ ฝสส.ขป.๔ ถึงแนวทางการดำเนินการ** ได้รับข้อมูลว่า สามารถทำได้ ๒ แนวทาง คือ สร้างเว็บไซต์ใหม่ หรือ เช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งสามารถเช่า Server อย่างเดียวได้ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการแล้ว การเช่าพื้นที่เว็บไซต์รวมถึงการขอจดโดเมนเนม มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ ๒,๖๐๐ บาท

ผคก.ขป.๓ ● **การขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน** สามารถทำได้โดยอำนาจการเช่าเป็นของ**ผู้อำนวยการสำนัก** โดยผ่านการเห็นชอบจาก**ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

ฝส.ขป.๓ ✦ มอบ **ผคก.ขป.๓** ดำเนินการขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน

๓.๕ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของโครงการฯ

ผอ.คป.นครสวรรค์ ● โครงการฯนครสวรรค์ขอหารือแนวทางในการปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้.-

๑. เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร กรณีขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ จากแม่น้ำ ไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎร บ้านกระทุ่มโทรน หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๗ และบ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นั้น โครงการฯ นครสวรรค์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือ และได้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยการขุดคลองส่งน้ำ แต่พื้นที่ขุดคลองส่งน้ำดังกล่าว ยังไม่ได้รับการยินยอมจากราษฎร ซึ่งราษฎรขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซื้อที่ดิน

๒. สืบเนื่องจาก ทาน รธว. เดินทางมาดูงานฝ่าย ๔ ตัว และได้สั่งการให้ดำเนินการซื้อที่ดินด้านข้างไว้เพื่อบำรุงรักษาฝายทั้ง ๔ ตัว

ผส.ชป.๓

✦ แนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้.-

๑. จัดทำแผนปักหลักเขต

๒. รังวัดที่ดิน

๓. ส่งแผนจัดซื้อที่ดินให้ ผจม.ชป.๓

การซื้อที่ดิน ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการขออนุมัติจากกรม ผ่าน ผส.มต. และปฏิบัติไปตามขั้นตอนต่อไป สำหรับกรณีที่ ๑ ขอให้เร่งทำหนังสือตอบสำนักงาน กปร. ในเบื้องต้นก่อน เพื่อรายงานแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ร้องขอโครงการ มอบ ผวศ.ชป.๓ พิจารณาในส่วนนี้ต่อไป

ผอ.คป.ยมน่าน ● ขอหารือแนวทางจัดหางบซ่อมแซมพื้นที่ฟูเนื่องจากอุทกภัย ซึ่งในเขต สชป.๓ มี ๒ โครงการ คือ โครงการฯ พิษณุโลก และโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ท่าน รธบ. ให้แนวทางว่า สามารถจัดหางบได้เลย แต่ต้องขออนุมัติในหลักการก่อน ในส่วนนี้โครงการส่งน้ำฯ ยมน่านจะเสนอเรื่องมาให้สำนักรวบรวม และเสนอ รธบ. อนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดหาต่อไป

- กรณีคันดินชำรุดเสียหายของ ปตร. คลองบางแก้ว เนื่องจากชาวบ้านบริเวณด้านท้าย ปตร. มีความกังวลว่า เมื่อถึงฤดูน้ำหลากอาจจะเกิดผลกระทบกับบ้านเรือนราษฎรบริเวณนั้นได้ ซึ่งโครงการก่อสร้าง สชป.๓ ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมแล้ว ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาซ่อมแซมคันดินบริเวณดังกล่าว คาดว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากอาจจะทำให้คันดินบริเวณนั้นชำรุดเสียหายมากยิ่งขึ้น

ผอ.คส.ชป.๓ ● เนื่องจากผู้รับจ้างจะซ่อมเฉพาะงานดิน และจะมาดำเนินการซ่อมแซมให้ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบหน้างานร่วมกับ ผวศ.ชป.๓ แล้ว

ผวศ.ชป.๓

● เห็นควรออกแบบปรับปรุงการทำ GABION ใหม่ และต้องดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง

ผปก.ชป.๓

● ขอเสนอให้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ระหว่างผู้เกี่ยวข้องและผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาต่อไป

ผอ.คป.ยมน่าน ● สืบเนื่องจาก ท่าน ผอ.ผง มาดูงานในพื้นที่ จึงได้หารือแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามวุฒิ ตามแนวทางที่กรมกำหนดว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามวุฒิ ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ หากโครงการฯ ใดจะจ้างตามวุฒิ โดยเบิกจ่ายจากค่าอำนาจการ เฉพาะงานนั้นๆ สามารถทำได้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกันของหน่วยงานในเขตสำนัก

ผส.ชป.๓

✦ หากกรมกำหนดแนวทางว่า สามารถจ้างตามวุฒิได้ โดยเบิกจ่ายจากค่าอำนาจการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของโครงการ

ผอ.คบ.ท่าบัว ● ขอให้สำนักจัดทำประกาศแผนการส่งน้ำให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์แผนการใช้น้ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร

ผอ.คป.พิจิตร ● การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่าง สขป.๓ กับ สขป.๔ ปัจจุบันพบปัญหาการร้องเรียนจากเกษตรกรไม่สามารถรับน้ำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนได้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพิจิตรบางส่วน รับน้ำจากแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำในเขตรับผิดชอบของ สขป.๔ ทำให้มีปัญหาในการทำงานและการประสานข้อมูลระหว่าง ๒ สำนัก จึงขอให้ สขป.๓ พิจารณาผลักดันให้เกิดเป็นโครงการส่งน้ำฯ แห่งใหม่ (โครงการส่งน้ำฯ วังบัว วัลยาง) จะดีกว่า และขอให้ สขป.๓ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ๒ สำนัก ในเรื่องวางแผนการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร ● ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันกรมได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโครงการฯ ทั้ง ๒ แห่งแล้ว ขอเรียนว่าโครงการส่งน้ำฯ วัลบัว โครงการส่งน้ำฯ วัลยาง และโครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดง กรมได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโครงการแล้ว แต่เนื่องจากโครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดงมีความพร้อมของระบบส่งน้ำมาก่อน จึงเปิดเป็นโครงการ สำหรับ ๒ โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรม

๓.๖ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของหน่วยงานสนับสนุน

ผศป.ที่ ๒ ● ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ขอความร่วมมือโครงการฯ ในสังกัด สำนักชลประทานที่ ๓ แจ้งข้อมูล กรณี การขอตั้งงบประมาณเอง (ตามตัวชี้วัดของสำนักเครื่องจักรกล ที่ทำกับกรมไว้ ของงานรถชุด งานเรือชุด งานรถแทรกเตอร์ โดยขอความกรุณาแจ้งศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนาม ในการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ได้ครบถ้วนในการจัดทำแผนงานและประมาณการ ซึ่งจะทำได้งบประมาณที่ได้รับสอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และทำให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ยินดีให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผส.ขป.๓ ✦ ขอให้โครงการฯ พิจารณากรณีที่เป็นงานดิน งานดำเนินการเอง ขอให้แจ้ง ผศป.ที่ ๒ ทราบในเบื้องต้นก่อน ตามที่ ผศป.ที่ ๒ ขอความร่วมมือ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ผส.ขป.๓ ✦ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ) นางสาวนันทริกา วงศ์ทะเล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแดง
ธก.ขป.๓

ผู้ตรวจงานการประชุม

