

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓
ประจำเดือน (ครั้งที่ ๓)
วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑.	ม.ล.อนุมาศ	ทองแถม	ผส.ชป.๓
๒.	ว่าที่ร้อยตรีสมชัย	แดงไทย	ผวศ.ชป.๓
๓.	นายชลเทพ	ทาดรี	ผบร.ชป.๓
๔.	นายโสภิญญา	เกิดสกุล	ผปก.ชป.๓
๕.	นายอดุลย์	จุมพิศ	แทน ผคก.ชป.๓
๖.	นางนงลักษณ์	โพธิ์ทอง	ผบพ.ชป.๓
๗.	นายบรรดิษฐ์	อินตะ	ผอ.คป.พิษณุโลก
๘.	นายสมยศ	แสงมณี	ผอ.คป.พิจิตร
๙.	นายสุรพล	อจละนันท์	ผอ.คป.นครสวรรค์
๑๐.	นายประพนธ์	คำไทย	ผอ.คป.เขื่อนนเรศวร
๑๑.	นายชัยโรจน์	พฤตมาวงศ์	ผอ.คป.พลายชุมพล
๑๒.	นายโฆสิต	พิ่งเมือง	ผอ.คป.ดงเครษฐี่
๑๓.	นายประเวศน์	ศิริศิลป์	ผอ.คป.ท่าบัว
๑๔.	นายสมหวัง	ปานสุขसार	ผอ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
๑๕.	นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผอ.คป.ยมน่าน
๑๖.	นายธนู	โพธิ์เอียง	ผอ.คส.ชป.๓
๑๗.	นายประสพ	มันแก้ว	แทน ผสญ.๑๔
๑๘.	นายวีระชัย	เชื้อวีระชน	แทน ผคน.๓
๑๙.	นายสุภัก	ทัฬหจันทร์	แทน ผศป.ที่ ๒
๒๐.	นายวินิต	มาพริก	แทน ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง
๒๑.	นางอัญชลี	โพธิ์คลี่	แทน สจจ.พิษณุโลก
๒๒.	นางสุวัฒนา	วัจฉลพงษ์	แทน สจจ.พิจิตร
๒๓.	นางสุพัตรา	เม่งตรี	สจจ.นครสวรรค์
๒๔.	นายเกษม	สงวนวงศ์	ผจม.๓
๒๕.	นายชัยวัฒน์	ทสะสังคินทร์	ผด.ผด.๓
๒๖.	นายวินัย	สุ่มเจริญ	ผส.รว.ภาคเหนือ
๒๗.	นายโสภี	ภูไพรชพงษ์	สร.รว.๓
๒๘.	นายผั่น	ศรีมา	สก.นช.๒
๒๙.	นายฉัตรชัย	ทองปอนด์	กอบ.ชป.๓
๓๐.	นายธีรพงษ์	บุญศัพย์	กพค.ชป.๓
๓๑.	นายประดิษฐ์	สิทธิยศ	กธว.ชป.๓
๓๒.	นายชานนท์	แก้วเขียว	ผสร.ชป.๓
๓๓.	นายธีระ	นวลปลอด	ผตว.ชป.๓
๓๔.	นายนพดล	เชาว์วรรณันท์	ผปช.ชป.๓
๓๕.	นายพรสุวรรณ์	อุปฮาด	ผปช.ชป.๓

๓๖.	นายเศรษฐา	สมจิตต์ชอบ	ฝคพ.ชป.๓
๓๗.	นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ฝงส.ชป.๓
๓๘.	นายทวีป	เกิดทอง	ฝปค.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ฝปท.ชป.๓
๓๙.	นายพีรรัตน์	เกตุพันธ์	ฝชน.ชป.๓
๔๐.	นายประเสริฐ	เฮงสุวรรณ	ฝงจ.ชป.๓
๔๑.	สิบเอกปัญญา	อ่ำเพียร	ฝสน.ชป.๓
๔๒.	นายจรรยา	จาดดี	ฝสส.ชป.๓
๔๓.	นายชัยวุฒิ	รชตะพิพัฒน์	นิติกร สชป.๓
๔๔.	นางราตรี	น้อยเจริญ	บง.ชป.๓
๔๕.	นางดวงใจ	ศรีศุภอรรรถ	พด.ชป.๓
๔๖.	นางนิสากร	อินแดง	ธก.ชป.๓
๔๗.	นายปริญญา	สมศักดิ์	ปชส.ชป.๓
๔๘.	นายพันธ์เทพ	แสงแก้ว	รอ.ชป.๓
๔๙.	นายภูมิจักษ์	รัตนผล	กอบ.คส.ชป.๓
๕๐.	นายกัมพล	บุญวิไล	ฝวศ.คป.พิษณุโลก
๕๑.	นายณัฐพล	ชุ่มสวัสดิ์	ฝวศ.คป.อุดรดิตถ์
๕๒.	นายรณชัย	ปราณพาณิชกิจ	ฝจน.คป.อุดรดิตถ์
๕๓.	นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ฝวศ.คป.นครสวรรค์
๕๔.	นายสาทิส	บุษดาจันทร์	ฝวศ.คป.เขื่อนนเรศวร
๕๕.	นายถาวร	ตะหวี	ฝจน.คป.ดงเครษฐี
๕๖.	นายวิชากร	จองพิพัฒน์พงษ์	ฝวศ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (รก.)
๕๗.	นายเทพนิมิต	สิงห์พันธ์	ฝวศ.คป.ยมานาน
๕๘.	นายตรีภพ	เกื้อเม่ง	ฝจน.คป.ยมานาน
๕๙.	น.ส.ฐิชารัตน์	โรจนจิรารัตน์	ช่างฝีมือสนาม ช ๓
๖๐.	น.ส.ธิดารัตน์	เดชจบ	พนักงานทั่วไป บ ๑
๖๑.	น.ส.นัณฐิกา	วงศ์ทะกั้น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝส.ชป.๓ ✦ กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ กรณีช่วงเข้ามีการประชุม (ณ ห้องประชุม ๒) จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้.-

๑.๑ การพิจารณาเป้าหมายคุ้มครองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.)

๑.๒ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)
ทั้งนี้ ขอให้ **ส่วนฝ่าย/โครงการ** พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบส่งภายในเวลาที่กำหนด

๒. ขอให้ ผอ.คป. ที่ไปประชุมจังหวัด รายงานนโยบาย และข้อสั่งการจากจังหวัด ที่เกี่ยวกับงานของชลประทานให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.คป.พิษณุโลก ● จังหวัดขอความร่วมมือออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับจังหวัดทุกครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปจัดที่อำเภอชาติตระการ

ผอ.คป.พิจิตร ● จังหวัดขอความร่วมมือออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับจังหวัดทุกครั้งและยังไม่มีข้อสั่งการจากจังหวัด

ผส.ชป.๓ ✦ การประชุมครั้งต่อไปขอให้ ผอ.คป.พิจิตร ชี้แจงให้จังหวัดทราบกรณีขอจัดสรรน้ำในเขตโครงการส่งน้ำฯตงเศรษฐี โครงการส่งน้ำฯท่าบัว ทางกรมไม่ขัดข้อง

ผอ.คป.นครสวรรค์ ● จังหวัดขอให้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในเขตจังหวัดนครสวรรค์และยังไม่มีข้อสั่งการจากจังหวัด

ผอ.คป.อุตรดิตถ์ ● จังหวัดประกาศพื้นที่เขตอำเภอปากท่า เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ผส.ชป.๓ ✦ ขอให้ **ผอ.คป. ผอ.คป.** ที่ได้รับนโยบาย และข้อสั่งการจากการประชุมจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมประจำเดือน สชป.๓ ทราบทุกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ผบท.ชป.๓ ● รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ **งานธุรการ สชป.๓** ได้นำขึ้น website ของสำนักแล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง**งานธุรการ สชป.๓** ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ที่ประชุม ● มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
สรุปข้อสั่งการ จากการประชุมประจำเดือนสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/มอบหมาย
๑.	ข้อสั่งการ : เกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์น้ำ - จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๗ - ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗	- ผบร.ชป.๓ - ผอ.คป. ผอ.คป.
๒.	ข้อสั่งการ เกี่ยวกับ : ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และบันทึกแจ้งกองแผนงาน - สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อติดตามในที่ประชุมครั้งต่อไป	- ผวจ.ชป.๓
๓.	ข้อสั่งการ เกี่ยวกับ : ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM) - ขอความร่วมมือโครงการฯ ส่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.๓ - ดำเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ที่กำหนดไว้ และพิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)	- ผวค.ชป.๓ ประสานกับโครงการฯ - ทีมงานจัดการความรู้

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/มอบหมาย
๔.	ข้อสั่งการ เกี่ยวกับ : เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหาร ทั่วไป - ดำเนินการขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน	- ผคก.ขป.๓

ข้อสั่งการที่ ๑ : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์น้ำ (การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๗ และตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗)

ผบร.ขป.๓ ● การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรืออาจเลื่อนไปถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ ฝนทิ้งช่วง และเกิดภัยแล้งยาวนาน สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำ ในส่วนแผนป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ มี กำหนดเวลาที่ต้องส่งกรมภายในสัปดาห์หน้า **สำนัก**ได้ทำหนังสือแจ้งให้**โครงการฯ** ส่งข้อมูลดังกล่าวให้**สำนัก** ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ แล้ว

● การตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้งปี ๒๕๕๗ **กรม**ได้จัดทำแผนที่ภาพถ่าย ดาวเทียม เพื่อตรวจสอบช่วงระยะเวลาปลูกข้าวว่า ช่วงไหนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากที่สุด และให้ **สำนัก**ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าตรงกับภาพถ่ายดาวเทียมหรือไม่

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้ประสานกับ**กองบิน ๔๖** แล้ว ซึ่งให้ความอนุเคราะห์กล้องที่ทันสมัยและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ภัยแล้ง ไว้เป็นข้อมูลชี้แจงกับเกษตรกรได้ ทั้งนี้ **ขอให้โครงการฯ** แจ้งพิกัดว่าจุดใดเป็นเขตภัยแล้ง

ผส.ขป.๓ ● ขอให้แต่ละ**โครงการฯ** ตรวจสอบพิกัดและพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ ส่งให้**สำนัก** รวบรวมพร้อมภาพถ่ายจาก**กองบิน ๔๖** แล้วส่งให้ทาง **Gistda** ตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์เพื่อ ปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ **มอบ ผบร.ขป.๓** รวบรวมข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการที่ ๒ : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และบันทึกแจ้งกองแผนงาน

๒. สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อติดตามในที่ประชุม ครั้งต่อไป

ผวจ.ขป.๓ ● ได้ตรวจสอบข้อมูลรายการก่อหนี้ผูกพัน และประสานกับ**กองแผนงาน**แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจาก**โครงการฯ**

ผอ.คป.อุดรดิตถ์ ● โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ มี ๑ รายการงาน คือ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มี ๑ รายการงาน คือ งานปรับปรุงระบบสื่อสาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสอบราคา เปิดซอง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ผอ.คป.เขื่อนนเรศวร ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร มี ๑ รายการงานที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เนื่องจากมีการยกเลิก e-Auction และดำเนินการอีกครั้งในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะดำเนินการลงนามในสัญญาได้

ผอ.คป.พิษณุโลก ● โครงการชลประทานพิษณุโลก มี ๑ รายการงาน คือ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการประกาศแล้ว มีผู้มายื่นเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ในจำนวนเท่ากันทั้งหมด จึงต้องยกเลิกและประกาศใหม่

ผส.ชป.๓ ✦ **มอบ ผงจ.ชป.๓** สรุปรายละเอียดข้อมูลและเหตุผล ที่โครงการฯ รายงานมาข้างต้น กรณี รายการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๒. สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน

ผงจ.ชป.๓ ● ได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรายงานในที่ประชุมแล้ว และจะได้รายงาน ในวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ข้อสั่งการที่ ๓ : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM)

ผวศ.ชป.๓ ๑. ขอความร่วมมือโครงการฯ ส่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.๓

- ปัจจุบันยังไม่มีโครงการฯใด ส่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.๓

ผส.ชป.๓ ✦ ขอความร่วมมือโครงการฯ ส่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้ **ผวศ.ชป.๓** เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.๓ ต่อไป

๒. พิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ผวศ.ชป.๓ ● ตามที่ได้มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สชป.๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนขององค์ความรู้ที่เลือก ๓ องค์ความรู้ และให้คณะทำงาน หมวด ๒-๖ กลับไปพิจารณาข้อคำถามของตนเองว่า ได้ติดตามประเด็น PMQA หรือไม่ ซึ่งคณะทำงาน ได้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ไว้ในเบื้องต้นแล้ว

* **การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)** แบ่งออกเป็น ๘ ด้าน ดังนี้.-

๑. ด้านพิจารณาโครงการ
๒. ด้านสำรวจ และออกแบบ
๓. ด้านการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
๔. ด้านพัสดุ
๕. ด้านการเงินและบัญชี
๖. ด้านก่อสร้าง
๗. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๘. ด้านธุรการ

ซึ่งกระผม (**ผวศ.ชป.๓**) ได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมชุมชนนักปฏิบัติร่วมกับ ผบท.ชป.๓ แล้ว และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เสนอ **ท่าน ผส.ชป.๓** พิจารณาลงนาม และขอเรียน **ผอ.โครงการ** ไว้ในที่นี้ด้วย เนื่องจากได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชุมชนนักปฏิบัติของ สชป.๓

ผศ.ชป.๓ ● สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม อยู่ในขั้นตอนที่ ๔ คือ การสื่อสาร ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ของ สชป.๓ ปี ๒๕๕๗ ไปให้ **ส่วน/ฝ่าย/โครงการ** ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบด้วย ในส่วนของความรู้ที่เป็นประโยชน์ จะเป็นความรู้ด้านใดก็ได้ **โครงการฯ** สามารถส่งเข้ามาได้เลย ทีมงานจัดการความรู้จะรวบรวมเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.๓

ข้อสั่งการที่ ๔ : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ การดำเนินการขอเช่า Server จาก ผู้ประกอบการเอกชน

ผสส.ชป.๓ ● ได้ประสานกับ ปชส.ชป.๓ แล้ว กรณีขอเช่า server จากผู้ประกอบการเอกชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรม โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร มีหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือในการยกเลิกการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอื่น (ที่ สศส ๙๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณลดความซ้ำซ้อนในการเช่าใช้บริการ และให้กรมชลประทานมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอความร่วมมือในการชะลอ/ยกเลิกการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอื่นไว้ก่อน

ผส.ชป.๓ ✦ มอบ ผบท.ชป.๓ พิจารณานำหนังสือจากกรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

๓.๑ การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

ผบร.ชป.๓ ● ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้.-

- เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน ๑,๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๘ %
- เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน ๒,๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๓ %
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้การได้จำนวน ๓๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔%

● สถานการณ์การเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ตามแผนเดิมได้ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบัน มีการเพาะปลูกแล้ว จำนวน ๑,๐๓๙,๐๐๐ ไร่ คิดเป็น ๒๘๘ % ซึ่งการเพาะปลูกเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ ทำให้ความต้องการใช้น้ำสูงขึ้น ปริมาณน้ำที่ใช้ไปแล้ว คิดเป็น ๒๒ % ณ **ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์** มีการระบายน้ำวันละ ประมาณ ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และ ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป การระบายน้ำจะลดลงเหลือ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ ๑๗๓ คิว/วินาที ซึ่งเราจะต้องทำการควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ N5A พิษณุโลก ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที **กรม**ได้มีการควบคุมการใช้น้ำเหนือเขื่อนนเรศวร รักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไว้ที่ +๔๗.๐๐ เมตร รทก. จากการสำรวจในปัจจุบันปรากฏว่า มี **บางโครงการฯ** ได้สิ้นสุดการส่งน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ แล้ว ขอให้**โครงการฯ** ที่สิ้นสุดแผนการส่งน้ำแล้ว ให้ชะลอการรับน้ำเท่าที่จำเป็น หากพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็ขอให้สิ้นสุดการส่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเกษตรกรถึงแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

● สำหรับแผนการส่งน้ำที่มีกำหนดว่าระบบคลองส่งน้ำที่จะไม่ส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากในเขตความรับผิดชอบ**บางโครงการฯ** เกษตรกรยังปลูกข้าวอยู่ ซึ่งอายุข้าวประมาณ ๒-๓ เดือน และขอให้**โครงการฯ** พิจารณาเลื่อนรอบเวรการส่งน้ำออกไปนั้น **สำนัก** ได้รายงานให้**กรม**ทราบแล้ว โดยขอขยายรอบเวรการส่งน้ำออกไปอีก ๑ รอบ สิ้นสุดถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง**กรม**ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ รทบ. ลงนาม

๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ผวจ.ขป.๓ ● สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเงินกันเหลือในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ และงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ที่	โครงการ	รวมเงินกันฯ (ล้านบาท)	สรุปภาพรวมเงินกันเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖				หมายเหตุ (ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
			๑.)งบตาม พรบ.	๒.) งบกลาง กรม. สัจจร	๓.)งบกลาง กปร.	๔.)งบกลาง สำรองจ่ายฯ	
	รวม	๑๓๕.๔๙๖	๒๙.๘๐๓	๔๔.๓๙๘	๒๖.๒๙๕	๓๕.๐๐๐	
๑	ขป.อุตรดิตถ์	๒๔.๔๔๔	๔.๖๐๐	-	๑๙.๘๔๔		๑.) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.- ๒.) ฝ่ายห้วยน้ำต๊ะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐.-
๒	ขป.พิษณุโลก	๒๒.๑๐๙	-	๑๕.๖๕๘	๖.๔๕๑		๑.) แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.- ๒.) ฝ่ายวังสัจจรฯ : ๖,๔๕๑,๐๐๐.-
๓	ขป.พิจิตร	๕๖.๓๙๐	๒.๐๐๐	๑๙.๖๙๒	-	๓๔.๖๙๘	๑.) ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒.) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.- ๓.) ระบบส่งน้ำบ้านไทรโรงโขนฯ : ๑๙,๘๒๙,๐๐๐.- ๔.) สถานีสูบน้ำ จากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง : ๑๔,๘๖๙,๒๐๐.-
๔	ขป.นครสวรรค์	๒๖.๓๑๐	๑๗.๔๑๐	๘.๙๐๐	-		๑.) สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : ๕,๖๕๕,๑๒๙.- ๒.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑ : ๑๑,๗๕๕,๑๐๑.- ๓.) ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : ๘,๙๐๐,๐๐๐.-
๕	ท่าบัว	๓.๑๕๔	๓.๑๕๔	-	-		๑.) ประดูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.- ๒.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประดู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.-
๖	เขื่อนแควน้อยฯ	๒.๖๓๙	๒.๖๓๙	-	-		๑.) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.-
๗	ส่วนกลาง สขป.๓	๐.๔๕๐	-	๐.๑๔๘	-	๐.๓๐๒	๑.) ค่าอำนวยการ ขุดลอกห้วยแก้วฯ : ๑๔๘,๐๐๐.- ๒) ค่าอำนวยการ ระบบส่งน้ำบ้านไทรโรง โขนฯ : ๑๗๑,๐๐๐.- ๓) ค่าอำนวยการ สถานีสูบน้ำ จาก แม่น้ำน่าน : ๑๓๐,๘๐๐.-

สรุป ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับ	รายการ	รวมเงินกัน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
รวม		๑๓๕.๔๙๖	๖๕.๗๗๔	๔๘.๕๕%	
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์		๒๔.๔๔๔	๒๐.๓๔๒	๘๓.๒๒%	
๑	ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.-	๔.๖๐๐	๒.๘๑๘	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๒	ฝายห้วยน้ำต๊ะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐.-	๑๙.๘๔๔	๑๗.๕๒๓	๘๘.๓๑%	งบกลาง กปร.
โครงการชลประทานพิษณุโลก		๒๒.๑๐๙	๒๑.๔๘๐	๙๗.๑๖%	
๓	แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.-	๑๕.๖๕๘	๑๕.๖๕๘	๑๐๐.๐๐%	งบกลาง ครม.สัญญา
๔	ฝายวังสัจธรรมฯ : ๖,๔๕๑,๐๐๐.-	๖.๔๕๑	๕.๘๒๒	๙๐.๒๕%	งบกลาง กปร.
โครงการชลประทานพิจิตร		๕๖.๓๙๐	๖.๐๙๘	๑๐.๘๐%	
๕	ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๖	ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.-	๑๙.๖๙๒	๔.๐๗๐	๒๐.๖๗%	งบกลาง ครม.สัญญา
๗	ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ	๑๙.๘๒๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
๘	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง	๑๔.๘๖๙	๐.๐๑๘	๐.๑๒%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
โครงการชลประทานนครสวรรค์		๒๖.๓๑๐	๑๗.๒๙๐	๖๕.๗๒%	
๙	สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : ๕,๖๕๕,๑๒๙.-	๕.๖๕๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
๑๐	ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลา : ๘,๙๐๐,๐๐๐.-	๘.๙๐๐	๗.๖๘๑	๘๖.๓๑%	งบกลาง ครม.สัญญา
๑๑	ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑	๑๑.๗๕๕	๙.๖๐๘	๘๑.๗๔%	งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๕
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว		๓.๑๕๔	๐.๔๕๖	๑๔.๔๗%	
๑๒	ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.-	๒.๖๙๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.-	๐.๔๕๖	๐.๔๕๖	๑๐๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย		๒.๖๓๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	
๑๓	ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.-	๒.๖๓๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบตาม พรบ.
ค่าอำนวยการสำนึกฯ		๐.๔๕๐	๐.๐๕๑	๑๑.๓๙%	
๑๔	ขุดลอกห้วยแก้วฯ : (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๔๘	๐.๑๑๕	๗๘.๓๐%	งบกลาง ครม.สัญญา
๑๕	ระบบส่งน้ำบ้านไพรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๗๑	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
๑๖	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง (ค่าอำนวยการ)	๐.๑๓๑	๐.๐๐๐	๐.๐๐%	งบกลาง สำรองจ่ายฯ
หมายเหตุ	โรงซ่อมเครื่องจักรกลพร้อมส่วนประกอบ	๐.๐๘๘	๐.๐๘๘	๑๐๐%	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒

ผส.ชป.๓ ✦ ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ

ผอ.คป.อุตรดิตถ์ ● **งานปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้ำ** : ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จะดำเนินการเซ็นสัญญาร่วมกัน ระหว่าง **ผอ.คป.อุตรดิตถ์** กับ **หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว** เมื่อเซ็นสัญญาแล้ว จะได้นำหนังสือส่งไปที่ **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)** และดำเนินการต่อไปได้

● **ฝายห้วยน้ำต๊ะ ๒** : ผลการดำเนินงาน ๗๐%

ผอ.คป.พิษณุโลก ● **ฝายวังสัจธรรมา** : จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ผอ.คป.พิจิตร ● **งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว** : ผลการดำเนินงานประมาณ ๕๕ %

- สำหรับงานระบบส่งน้ำบ้านไทรโรงโขน บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ ได้สั่งเข้าทำงานแล้ว **งานระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไปตำบลท่าหลวง** ทั้ง ๒ งาน เป็นงบกลางสำรองจ่าย ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปผลการเบิกจ่าย

ผอ.คป.นครสวรรค์ ● **สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา** : ยังติดปัญหาเรื่อง แก๊ซสัญญาที่กรม

ผส.ชป.๓ ✦ มอบ **ผอ.คป.นครสวรรค์** ติดตามการดำเนินการแก๊ซสัญญาที่กรม

ผอ.คป.ท่าบัว ● **งานประตुरบายน้ำปากคลอง DR.๗** : ผลการดำเนินงานเสร็จแล้ว ๑๐๐ % อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผอ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ● **งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน** : ปัจจุบันทำเรื่องเสนอกรมแล้ว คาดว่าจะสั่งเข้าทำงานได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ผวจ.ชป.๓ ● **คำอำนวยการของสำนัก** มี ๓ รายการงาน ดังนี้-

๑. **งานขุดลอกห้วยแก้ว**ฯ เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๓๐%

๒. **งานระบบส่งน้ำบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ**

๓. **งานระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไป ต.ท่าหลวง**

งานลำดับที่ ๒-๓ ได้รับงบประมาณเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีเพิ่มเติม ๑ รายการงาน คือ **โรงซ่อมเครื่องจักรกลพร้อมส่วนประกอบ** (ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒)

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2557 (ทุกประเภทงบประมาณ)

ซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบ GFMIS ประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ที่	ประเภทงบประมาณ	โอนจัดสรร (บาท)	1.) ผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557		2.) เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา		
			วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		คงเหลือยังไม่เบิก (บาท)	ครั้งที่ 31 มกราคม 2557 (%)	เบิกเพิ่มขึ้น (%)
			(บาท)	(%)			
	สรุป ภาพรวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)	514,690,637	129,083,272	25.08%	385,607,365	18.96%	6.12%
ข้อ 1	งบตาม พรบ. ปี 2556 (ปรากฏข้อ+LS.)	514,690,637	129,083,272	25.08%	385,607,365	18.96%	6.12%
ข้อ 2	งบกลาง ครม. สัญจร ปี 2557	-	-	-	-	-	-
ข้อ 3	งบกลาง กปร. โครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-
ข้อ 4	เงินกันเหลือในปี	135,496,372	65,774,192	48.54%	69,722,180	40.87%	7.67%
	3.1 กันเหลือปี 2555	11,755,101	9,608,989	81.74%	2,146,112	71.54%	10.20%
	3.2 กันเหลือปี 2556	123,741,271	56,165,203	45.39%	67,576,068	37.95%	7.44%

เป้าหมายเบิกจ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2557 ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ของ กรมฯ, สชป.3

- เป้าหมายเบิกจ่ายของ กรมฯ
- เป้าหมายเบิกจ่ายของ สชป.3
- ผลเบิกจ่าย ปัจจุบัน เฉลี่ย 17 สชป.


15.00%
53.31%
15.81%

ผลเบิกจ่าย
 ↑ สูงกว่า เป้าหมาย กรมฯ
 ↓ ต่ำกว่า เป้าหมาย สชป.3
 ↑ สูงกว่า ผลเบิกจ่ายเฉลี่ย 17 สชป.
 (ผลเบิกจ่ายอยู่ ลำดับที่ 3)

ฝงจ.ชป.๓ ● สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับโครงการฯ) จากระบบ Online (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับ โครงการ) จากระบบ online

ที่	โครงการ	โอนจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย		ลำดับครั้ง ที่ผ่านมา
			(บาท)	(%)	
1	ชป.พิษณุโลก	153,458,474	91,429,875	59.58	1
2	ชป.อุดรดิตต์	55,578,000	32,539,298	58.55	2
3	ชป.นครสวรรค์	81,982,420	28,216,553	34.42	3
4	เขื่อนนเรศวร	16,361,200	3,297,860	20.16	5
5	ก่อสร้าง	67,560,100	10,838,894	16.04	7
6	ทำบัว	64,182,983	9,311,8836	14.54	6
7	ชป.พิจิตร	69,201,800	9,552,070	13.80	4
8	ดงเศรษฐี	20,669,751	1,517,636	7.34	11
9	พलयชุมพล	41,156,352	2,829,667	6.88	8
10	เขื่อนแควน้อยฯ	34,228,929	989,894	2.89	9
11	ยมน่าน	5,060,600	315,933	1.29	9
			average	21.40	12.23%

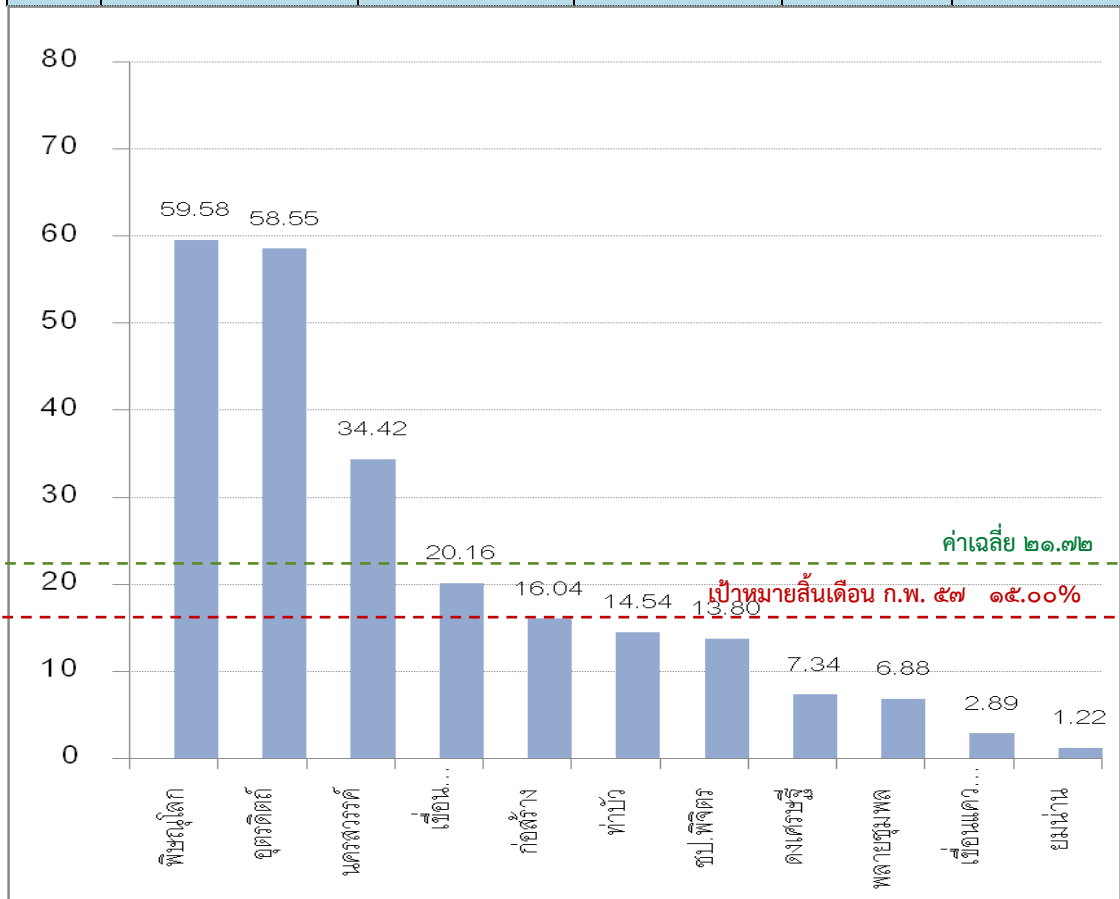

ผอ.ค.บ.ยมน่าน ● งานขุดลอกคลองระบายน้ำคลองบางแก้ว ได้รับการโอนเงินงบประมาณ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการแจ้งเข้าดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ผอ.ค.บ.เขื่อนแควน้อย ● งานติดตั้งท่อนป้องกันสวะ (Log Boom) ปัจจุบันสั่งเข้าดำเนินการแล้ว อยู่
ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ผอ.ค.บ.ดงเสาชรี ● ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง (เกี่ยวกับการใช้แรงงานคนเป็นหลัก) อยู่ระหว่าง
รอผลการเบิกจ่ายค่าแรงคนงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ผอ.ค.บ.พลาญชุมพล ● ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง (เกี่ยวกับการใช้แรงงานคน) อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ผจ.ขป.๓ ● รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบลงทุน : ทุกประเภทงาน)
ของหน่วยงานส่วนกลาง และงานฝาก ที่เบิกจ่ายโดย สขป.๓ จำนวน ๗ หน่วยงาน

สรุปภาพรวม ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบลงทุน : ทุกประเภทงาน)

หน่วยงานส่วนกลาง และงานฝาก ที่เบิกจ่ายโดย สขป.3

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ที่	โครงการ/หน่วยงาน	ผลการอนุมัติเงินงวด (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		
1	สถานีทดลองการใช้น้ำที่ 2	2,200,000		2,200,000	168,468		168,468	7.66%	2,031,532
2	ศูนย์อุทกวิทยา	8,995,400		8,995,400	2,104,134		2,104,134	23.39%	6,891,266
3	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2	18,938,400		18,938,400	1,432,942		1,432,942	7.57%	17,505,458
4	งานสำรวจกันเขต 3	6,411,800		6,411,800	1,790,158		1,790,158	27.92%	4,621,642
5	ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 3	5,127,900		5,127,900	0		0	0.00%	5,127,900
6	สำนักสำรวจฯ (กรม)	602,000		602,000	334,840		334,840	55.62%	267,160
7	ฝ่ายจัดหาที่ดิน 3	1,500,000		1,500,000	542,172		542,172	36.14%	957,828
	รวม	43,775,500	0	43,775,500	6,372,714	0	6,372,714	14.56%	

ผด.ผด.๓ ● ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน ๕ ล้านบาท เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่ม
ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สิ้นสุดงานประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
สำหรับเงินอีกส่วนหนึ่ง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานสำรวจของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๓ ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%

ผจ.ม.๓ ● เป็นค่าดำเนินการ ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ผจ.ขป.๓ ● รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ Online ขอให้**โครงการฯ** ก้าวข้ามเจ้าหน้าที่ลง
รายการข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ผส.ขป.๓ + มอบ ผงจ.ขป.๓ ติดตามโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมถึงลงรูปถ่ายประกอบโครงการก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน (กรณีผลงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%) ในระบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ Online

ผปค.ขป.๓

- เร่งรัดดำเนินการ ๑ โครงการ ๑ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- * ขอให้โครงการฯ จัดทำอนุประมาณการ พร้อมทั้งสำเนาอนุประมาณการที่ผ่านการอนุมัติจาก ผอ.โครงการแล้ว ให้ ท่าน ผส.ขป.๓ ทราบด้วย
- * ขอให้จัดทำแผนงานตามรายละเอียด แบบ สบอ.ปส๐๖ ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (ค่าจ้างเหมาไม่น้อยกว่า ๔๐%) หรือไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- * ขอให้โครงการฯ ที่จัดทำประมาณการค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
- * เร่งรัดให้โครงการฯ ดำเนินการส่งแผนงาน MTEF ผลผลิตที่ ๑ การจัดการน้ำ ชลประทาน

ผส.ขป.๓ + ขอความร่วมมือโครงการฯ เร่งรัดดำเนินการ ตามที่ ผปค.ขป.๓ รายงาน และรวบรวมส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด มอบ ผปค.ขป.๓ รวบรวมและติดตาม

๓.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM)

ผส.ขป.๓ + ขอนำความรู้ประสบการณ์ทำงานไปถ่ายทอดในคราวประชุมครั้งต่อไป

๓.๔ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผวศ.ขป.๓ ● ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยังไม่เพิ่มขึ้น แผนงานเตรียมความพร้อมโครงการ มี ๑๕๔ โครงการ ได้รับงบประมาณเป็นบางส่วน และยังไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ผลการปฏิบัติงานยังไม่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ ๒๐%

ผบท.ขป.๓ ● การขออนุญาตไปอบรมของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรณีการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก สบค. ได้มีหนังสือ ที่ สบค. ๑๑๕๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการศึกษาอบรมในประเทศ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติไว้ ซึ่งการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จะต้องให้สำนักเป็นผู้เสนอกรม อย่างน้อย ๕ วัน แต่ในการปฏิบัติจริงที่ผ่านมา พบว่า โครงการฯ จัดส่งหนังสือให้สำนักล่าช้า คือ กรมกำหนดเวลาไว้ ๕ วัน ดังนั้น สำนักจำเป็นต้องกำหนดให้โครงการฯ ส่งหนังสือ ภายใน ๒ วัน สำหรับกรณีที่หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม ให้โครงการฯ โดยตรง บุคลากรจะสามารถไปเข้ารับการศึกษาอบรมได้นั้น ต้องเสนอผู้บริหาร ให้เป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา ขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สบค. มีหนังสือเวียนให้แนวทางในการปฏิบัติด้วย

๓.๕ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของโครงการฯ

ผอ.คป.พลาญชุมพล ● ขอรับการจัดสรรน้ำในรอบวันที่ ๕ เป็นช่วงวันที่ ๒๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

๓.๖ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมของหน่วยงานสนับสนุน

ผศป.ที่ ๒ ● ขอชี้แจงรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ดังนี้.-

๑. ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดจำนวน ๑,๘๙๓๘,๔๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด เป็นค่าซ่อมแซมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ค่าซ่อมแซมใหญ่รถชุด ประมาณ ๕ ล้านบาท และค่าซ่อมแซมใหญ่เรือชุด ประมาณ ๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗.๕๗%

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานรถชุด-เรือชุด ในพื้นที่ สขป.๓ ดังนี้.-

- ✓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำบัว ได้รับงานมา ๒๐%
- ✓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ได้รับงานมา ๘๐%

ทั้ง ๒ งาน เริ่มดำเนินงานแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผอ.คบ.พิจิตร ● ขอเรียนหารือ กรณีน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ สืบเนื่องจาก **ท่าน รรบ.** สอบถามว่า ในแต่ละสถานีน้ำมีน้ำหายไปด้วยสาเหตุใด โดยเฉพาะสถานี N8A ที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ถึงสถานี N.67 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้ำหายไปประมาณ ๒๐ คิว ขอให้หลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนี้ด้วย ในเบื้องต้นทาง**โครงการฯ** ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจแล้ว

● การคำนวณคิวน้ำที่ผ่านสถานี ขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เห็นควรให้**ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง** พิจารณาตรวจสอบ

ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง ● **ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง** จะพิจารณาตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เครื่องมือในการตรวจวัด ทั้งนี้ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง จะได้ประสานข้อมูลกับศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท

ผบร.ขป.๓ ● ขอให้**ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง** ประสานกับ **ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง** เพื่อเข้าไปตรวจวัดในจุดที่แม่น้ำยม รวมกับแม่น้ำน่าน ว่ามีน้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่แม่น้ำยมหรือไม่ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พบว่ามีน้ำหายไป ประมาณ ๕๐ คิว

ผส.ขป.๓ ✦ มอบ **ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง** พิจารณาตรวจสอบเรื่อง **การวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีตรวจวัดในเขต สขป.๓** พร้อมประสานข้อมูลกับ **ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง** จังหวัดชัยนาท ด้วย

ผอ.คบ.พิษณุโลก ● ขอให้ **ผบร.ขป.๓** รวบรวมข้อมูลแผนการส่งน้ำและสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแจ้ง**ประมงจังหวัด** ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงผู้ประกอบการกระชังปลาต่อไป

ผจม.๓ ● งานโครงการ**พิษณุโลกฝั่งซ้าย** เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องผ่านการพิจารณาจาก ครม. ก่อน

ผวศ.ขป.๓ ● ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน **มาดูงานโครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย** ร่วมกับ**สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก** และประชุมร่วมกันที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นจะไป**ดูงานจัดรูปที่ดินในเขตโครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน**

ผคน.๓ ● โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๓ มีงานที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๗ ขณะนี้**ปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการท่ามะเฟือง** อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ประมาณ ๑,๗๘๐ ไร่ เป็นงานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๑๒%

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย ● ขอให้**สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก** ส่งข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของ**โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** ให้ทราบด้วย

สจจ.พิษณุโลก ● ปัจจุบัน**สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก** ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน และจะได้เตรียมข้อมูลให้**โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** ทราบต่อไป

สท.นช.๒ ● **สถานีทดลองการใช้น้ำที่ ๒** มีงานที่ดำเนินการ ๒ รายการงาน ได้ดำเนินการสอบราคาแล้ว แต่ยังไม่จัดซื้อวัสดุ

● งบประมาณสำหรับงานวิจัย ในพื้นที่ของสถานีทดลองการใช้น้ำที่ ๒ มี ๒ งาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาวิจัย ดังนี้-

- ✓ การบริหารจัดการน้ำในแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งของพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ๒
- ✓ ผลกระทบของระบบการใช้น้ำแบบไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวที่

ปลูกในเขตจังหวัดพิษณุโลก

หากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะได้นำผลการศึกษาดังกล่าว มารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ผศ.ชป.๓ ● ขอรายงานเรื่องชมรมกีฬากอล์ฟ ตามที่ได้มีการประชุมการดำเนินการด้านกีฬา กอล์ฟ สชป.๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น **ท่าน ผศ.ชป.๓** เป็นประธานในการประชุม **ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น **"ชมรมกอล์ฟชลประทาน ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๓"** และขอเรียนเชิญ **ผอ.โครงการ** และ**หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๓** ร่วมชมรมกอล์ฟด้วย ทั้งนี้ จะทำคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษา โดยในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จะเริ่มดำเนินการกิจกรรม จึงเรียนให้ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมกอล์ฟ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ผอ.คบ.พลาญชุมพล ● เรื่องกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ ในปีนี้จะเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ในส่วนของกิจกรรมกีฬาได้วางแผนการแข่งขันไว้ ประมาณ ๔-๕ ประเภท รวมถึงกีฬามหาสนุกด้วย กีฬาบางประเภทต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม และเริ่มดำเนินการแข่งขันก่อนกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนัก ทั้งนี้ ต้องรอกำหนดการจัดงานวันสงกรานต์ของสำนักก่อน พุธนี้ (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗) จะทำหนังสือถึงสำนักเกี่ยวกับแผนการจัดแข่งขันกีฬา

ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร ● การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้งานน้ำของเกษตรกร กรณีเกษตรกร ประมาณ ๒๐๐ คน ร้องเรียนเรื่องการใช้งานน้ำ โดยได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหากับ **ท่าน ผศ.ชป.๓ ผบร.ชป.๓ ผอ.คป.พิษณุโลก** และได้แก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้ให้ไว้แล้ว เป็นที่พอใจแก่เกษตรกร

ผอ.คป.พิษณุโลก ● โครงการชลประทานพิษณุโลก ขอทราบข้อมูลงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางในเขตโครงการฯ เพื่อจะได้ประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ต่อไป

ผอ.คส.ชป.๓ ● เห็นควรให้สำนักทำหนังสือเชิญ ผสท.๓พท. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักด้วย

ผส.ชป.๓ ✦ การประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ขอให้ **ผบท.ชป.๓** เชิญ **ผสท.๓พท.** เข้าร่วมประชุมด้วย

- ✦ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) นางสาวนันทริกา วงศ์ทะเล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแดง
ธก.ชป.๓
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

